

Iktatószám: 368/2017 Fülk. u. 473/2017.
IKT-2017-612-11-00020 83

Kedvezményezett neve: **Pilismarót Község Önkormányzata**

Projekt címe: **Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése Pilismarót és Dömös községben**

Projekt azonosítószám: **TOP-4.1.1-15-KO1-2016-00012**

Támogatási Szerződés

amely létrejött

egyrésztől a Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága (1051 Budapest, József Nádor tér 2-4.), mint támogató (a továbbiakban: **Támogató**) képviselőjében eljáró Magyar Államkincstár Komárom - Esztergom Megyei Igazgatósága

Postacím: 2800 Tatabánya, Pf.: 1305

Székhely: 1054 Budapest, Hold utca 4.

Aláírásra jogosult képviselője: Wurczler Irén igazgató; Börgöndi Szilárd irodavezető; Tomasi Zoltánné osztályvezető

Azonosító szám (törzs-szám): 237309, PIR törzsszám: 329970

Adószám: 15329970-2-41

másrésztől **Pilismarót Község Önkormányzata**, mint kedvezményezett (a továbbiakban: **Kedvezményezett**),

Postacím: 2028 Pilismarót, Rákóczi utca 15.

Székhely/Lakcím: 2028 Pilismarót, Rákóczi utca 15.

Azonosító szám (törzs-szám/Cégjegyzékszám): 729819

Adószám/adóazonosító jel: 15729813-2-11

Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül: 12025000-00208790-00100003

Aláírásra jogosult képviselője: Pergel István Csaba polgármester

(Támogató és Kedvezményezett a továbbiakban együtt: **Szerződő Felek**) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.

1. Előzmények

A Támogató a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (a továbbiakban: **TOP**) keretén belül TOP-4.1.1-15 Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése tárgyú felhívást tett közzé, melyre Kedvezményezett **TOP-4.1.1-15-KO1-2016-00012** azonosító számon regisztrált, 2016.05.04. napon befogadott támogatási kérelmet nyújtott be, a Szerződés mellékletét képező felhívás szerint, amelyet a Támogató 2017.06.13. napon kelt támogatási döntés szerint támogatásban részesített. A Támogató döntése alapján Kedvezményezett vissza nem térítendő támogatásban részesül.

A felhíváson és a támogatási kérelmen túl a Szerződés mellékletét képezi, és a Szerződő Felekre kötelező érvényű minden olyan tanulmány, elemzés, hatósági engedély, műszaki terv és tartalom, nyilatkozat, beszerzési terv, társulási megállapodás és egyéb dokumentum, valamint ezek módosításai, amelyet a Kedvezményezett a támogatási kérelemmel együtt vagy a későbbiekben benyújtott, akkor is, ha azok fizikai értelemben nem kerülnek csatolásra a Szerződéshez.

2. Szerződés tárgya

Az Előzményekben meghatározottak szerint Szerződő Felek az alábbi Szerződést kötik:

2.1. A Szerződés tárgya az **Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése Pilismarót és Dömös községben** című és **TOP-4.1.1-15-KO1-2016-00012** azonosító számú, a támogatási kérelemben és annak mellékleteiben rögzített projekt (a továbbiakban: **Projekt**) elszámolható költségeinek az Európai Regionális Fejlesztési Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatás formájában történő finanszírozása.

2.2. A Kedvezményezett vállalja, hogy a Projektet 2028 Pilismarót, Köztársaság tér 3. (Helyrajzi szám: 268) (Projekt fő helyszíne) és 2027 Dömös, Szent István utca 15. (Helyrajzi szám: 527) alatt megvalósítja, és azt a fenntartási időszak alatt ugyanezen a helyeken fenntartja, üzemelteti.

A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kötelezi magát arra, hogy a Projektet a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, kellő alaposággal, hatékonysággal és gondossággal valósítja meg, illetve a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben [a továbbiakban: 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet] rögzített feltételek fennállása esetén az ott előírt módon a közbeszerzési eljárások lebonyolításába a Támogatót és a Miniszterelnökséget bevonja.

2.3. A Támogató vállalja, hogy a Projekt elszámolható költségeire az Európai Regionális Fejlesztési Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból a támogató döntésnek és a Szerződésben foglaltaknak megfelelően vissza nem térítendő támogatást nyújt.

2.4. A Szerződés elválaszthatatlan részét képezi az „Általános Szerződési Feltételek az operatív programok keretében támogatásban részesített kedvezményezettekkel kötendő támogatási szerződésekhez” (a továbbiakban: ÁSZF), amely a www.szechenyi2020.hu honlapon folyamatosan elérhető.

3. A Projekt megvalósításának időbeli ütemezése

3.1. A Projekt kezdete

A Projekt megvalósítási időszakának kezdő időpontja: 2017. év 06. hó 01. nap.

3.2. Költségek elszámolhatóságának kezdete

A Projekt költségei elszámolhatóságának kezdő időpontját a felhívás határozza meg.

A Projekt keretében az ezt követően felmerült kiadásokat lehet elszámolni.

3.3. A Projekt fizikai és pénzügyi befejezése

3.3.1 A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2018. év 12. hó 31. nap.

A Projekt keretében a projekt fizikai befejezésének napjáig felmerült költségek számolhatók el. Az ezen időpontot követően keletkezett költségre támogatás nem folyósítható.

3.3.2 A záró kifizetési igénylés benyújtásának határideje: 2019. év 03. hó 31. nap.

A Projekt pénzügyi befejezésére, megvalósítására és lezárására vonatkozó rendelkezéseket az ÁSZF 14.1 pontja tartalmazza.

4. A Projekt összköltsége, elszámolható összköltsége, a támogatás forrása, összege

4.1. A Projekt összköltsége

A Projekt összköltsége 79.069.098,- Ft, azaz hetvenkilencmillió-hatvankilencezer-kilencvennyolc forint.

4.2. A Projekt elszámolható összköltsége

A Projekt elszámolható bruttó összköltsége 58.171.804,- Ft, azaz ötvennyolcmillió-százhetvenegyezer-nyolcszázötven forint.

A Projekt költségvetését a Szerződés 1. melléklete tartalmazza.

4.3. A Projekthez felhasználásra kerülő források

A Projekthez felhasználására kerülő források részletes bontását a Szerződés 2. melléklete tartalmazza.

4.4. A támogatás összege és intenzitása

A támogatás intenzitása a Projekt elszámolható összköltségének 100 %-a, de legfeljebb 58.171.804,- Ft, azaz ötvennyolcmillió-százhetvenegyezer-nyolcszáznegy forint.

Amennyiben az egyes tevékenységekre vonatkozóan a támogatási intenzitás eltér, költségelemenként az eltérő intenzitást a Szerződés 1. melléklete tartalmazza.

4.5. Támogatás igénylése

4.5.1 A támogatási előleg összege és mértéke

Az igényelhető támogatási előleg mértéke az utófinanszírozású tevékenységekre jutó támogatási összeg legfeljebb 100 %-a.

Az igényelhető támogatási előleg legmagasabb összege 58.171.804,- Ft, azaz ötvennyolcmillió-százhetvenegyezer-nyolcszáznegy forint.

- Pilismarót Község Önkormányzata: 45.544.932,- Ft, azaz negyvenötmillió-ötszáznegyvennégyezer-kilencszázharminckettő forint.

- Dömös Község Önkormányzata: 9.600.000,- Ft, azaz kilencmillió-hatszázézer forint.

- Komárom-Esztergom Megyei Területfejlesztési Korlátolt Felelősségű Társaság: 1.513.436,- Ft, azaz egymillió-ötszázötvenháromezer-négyszázharminchat forint.

4.5.2 Kifizetési igénylés

A Szerződés 3. melléklete szerinti mérföldkövek elérését követő 15 napon belül kötelező szakmai beszámolót is tartalmazó kifizetési igénylést benyújtani. A projekt fizikai befejezéséhez kapcsolódó utolsó mérföldkő esetén a támogatási szerződésben meghatározott határidőn belül köteles a Kedvezményezett a kifizetési igénylésben beszámolni a projekt keretében felmerült és elszámolni kívánt költségekről.

A mérföldkövek elérését megelőzően az ÁSZF 3.5.1 pontja szerint lehetséges kifizetési igénylést benyújtani.

4.6. Támogatás jogcíme

A 2014-2020 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló 255/2014. (X.10.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: jogcímrendelet) foglaltaknak megfelelően a jelen Szerződés alapján nyújtott támogatásból

58.171.804,- Ft, azaz ötvennyolcmillió-százhetvenegyezer-nyolcszáznegy forint **nem minősül** az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatásnak.

5. A Projekt műszaki-szakmai tartalma

A Kedvezményezett a Projektet a 4. mellékletben meghatározott műszaki-szakmai tartalom szerint valósítja meg.

A műszaki-szakmai tartalom nem teljesítése esetén a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 1. mellékletének 65.4 pontjában szabályozottaknak megfelelően kell eljárni.

6. A Projekt megvalósításának mérföldkövei, indikátorai és műszaki-szakmai eredményei

A Kedvezményezett a Projektet a 3. mellékletben meghatározott mérföldkövek szerint valósítja meg.

A Kedvezményezett a Projekt megvalósítása során a támogatást az 5. mellékletben meghatározott indikátorok és műszaki-szakmai eredmények elérése érdekében jogosult és köteles felhasználni.

A Kedvezményezett az indikátorokat köteles teljesíteni. Az indikátorok nem teljesítése esetén a

272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 88. §-ban szabályozottaknak megfelelően kell eljárni.

7. Biztosítékadási kötelezettség

Amennyiben a Kedvezményezett a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 84. §-a alapján nem mentesül a biztosítéknyújtási kötelezettség alól, úgy a Szerződés 6. mellékletében foglaltak szerinti biztosító(ka)t nyújtja.

A 6. melléklet az ÁSZF-ben, a felhívásban, valamint a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendeletben foglalt szabályok szerinti, szabályszerű benyújtástól válik a Szerződés részévé.

8. Egyéb rendelkezések

-

9. Záró rendelkezések

9.1. A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kijelenti, hogy a Szerződés tartalmát, az ÁSZF-et, és a vonatkozó jogszabályokat, így különösen az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényt, a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendeletet és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletet ismeri és magára nézve kötelezőnek ismeri el, és tudomásul veszi, hogy a Szerződés, valamint az ÁSZF a vonatkozó jogszabályok módosításával, illetve új, a Szerződés és az ÁSZF szempontjából releváns jogszabályok hatálybalépésével minden külön intézkedés nélkül módosulnak.

9.2. A Szerződő Felek a Szerződés időtartamára kapcsolattartót jelölnek ki. A kapcsolattartó nevééről, postacíméről, telefon és telefax számáról és elektronikus levélcíméről a Szerződés aláírásával egyidejűleg, változás esetén pedig a változást követő 8 napon belül tájékoztatják egymást.

9.3. A Szerződés hatályba lépésének napja megegyezik a Szerződő Felek közül utolsóként aláíró aláírásának napjával. A Szerződés határozott időre jön létre, 2027. december 31-én, illetve amennyiben a fenntartási időszak végének dátuma ennél későbbi, úgy a fenntartás időszak végén hatályát veszti.

9.4. A Kedvezményezett kijelenti, hogy - az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásainak megfelelően - a projekt adatlapon feltüntetett projektfelelős, a projekt adatlapon és mellékleteiben feltüntetett más személyek, illetve a Projekt megvalósításában résztvevő személyek, valamint a beszámolás, a szabálytalansági eljárás és az ellenőrzési tevékenység során átadott dokumentumokban feltüntetett személyek személyes adataiknak a Támogató és a Miniszterelnökség által történő kezeléséhez (ideértve ezen adatok felvételét, tárolását, nyilvánosságra hozatalát, statisztikai módszerekkel történő feldolgozását is) kifejezetten hozzájárultak. Ennek alapján a Kedvezményezett szavatol azért, hogy ezen személyes adatok fentieknek megfelelő kezelése az érintettek hozzájárulásával történik.

9.5. A Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó magyar - ide értve a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényt is - és európai uniós jogszabályok rendelkezései az irányadók.



9.6. A Kedvezményezett képviselőjében aláíró személy(ek) kijelenti(k) és cégkivonatával/cégkivonatukkal, valamint aláírási címpéldányával/címpéldányukkal igazolja/igazolják, hogy társasági dokumentumai/alapító okirata alapján, a Szerződés bevezető részében feltüntetettek szerint jogosult(ak) a Kedvezményezett képviselőjére (és cégjegyzésére), továbbá ennek alapján a Szerződés megkötésére és aláírására. Aláíró képviselő(k) kijelenti(k) továbbá, hogy a testületi szervei(k) részéről a Szerződés megkötéséhez szükséges felhatalmazásokkal rendelkezik/rendelkeznek, tulajdonosai(k) a támogatási jogügyletet jóváhagyták és harmadik személyeknek nincs olyan jogosultsága, mely a Kedvezményezett részéről megakadályozná vagy bármiben korlátozná a Szerződés megkötését, és az abban foglalt kötelezettségek maradéktalan teljesítését.

Korrupció-ellenes záradék

A Kedvezményezett nem követhet el, nem engedélyezhet, illetve harmadik személyt nem jogosíthat fel olyan cselekményekre, amely a közélet tisztaságára vonatkozó, valamint a korrupció-ellenes jogszabályok megsértését eredményezi. A Kedvezményezett nem fogadhat el, nem ajánlhat fel és nem adhat az eljáró harmadik személynek ajándékot, illetve pénzbeli vagy nem pénzbeli juttatást.

A Szerződés 5 oldalon és 4 db eredeti példányban készült. A Szerződéshez csatolt 15 db melléklet, és a Szerződéshez fizikai értelemben nem csatolt, de a Szerződésben vagy az ÁSZF-ben hivatkozott mellékletek, továbbá a projekt adatlap és annak mellékletét képező valamennyi nyilatkozat, dokumentum a Szerződés elválaszthatatlan része.

Szerződő Felek a Szerződést átolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták.

<p><i>[Handwritten signature]</i></p> <p>Kedvezményezett</p>  <p>Kelt: Pilismarót, 2017. év július hónap <i>18.</i> napján</p>	<p><i>[Handwritten signature]</i></p> <p>Közreműködő Szervezet</p> <p>Börgöndi Szilárd irodavezető</p> <p>Tomasik Zoltán osztályvezető</p>  <p>Kelt: Tatabánya, 2017. év július hónap <i>18.</i> napján</p>
--	--

Mellékletek:

1. melléklet - A Projekt költségvetése
2. melléklet - A Projekt forrásai
3. melléklet - A Projekt mérföldkövei
4. melléklet - A Projekt műszaki-szakmai tartalma és eredményei
5. melléklet - A Projekt indikátorai
6. melléklet - Biztosítékokra vonatkozó nyilatkozatok, szerződések, megállapodások
7. melléklet - Konzorciumi együttműködési megállapodás
8. melléklet - Közbeszerzési terv
9. melléklet - Rövid összefoglalás a projektről
10. melléklet - Projekt helyszíne
11. melléklet - Kommunikációs terv
12. melléklet - Konzorciumi tagok esetében (amennyiben korábban nem került benyújtásra): aláírási címpéldány/aláírás minta, valamint amennyiben delegált jog, az aláírási jogosultságot igazoló dokumentum
13. melléklet - Nyilatkozat arról, hogy a tervezett költségeket, tevékenységenként, utófinanszírozás vagy szállítói finanszírozás keretében kívánja elszámolni
14. melléklet - Egyéb a projekthez tartozó alátámasztó dokumentum (ok)
15. melléklet - A "Széchenyi 2020 Kedvezményezettek tájékoztatási kötelezettségei útmutató és arculati kézikönyv"-ben foglaltaknak megfelelően, a nyilvánosság és a tájékoztatás biztosítása érdekében tervezett tevékenységek

A PROJEKT KÖLTSÉGVETÉSE

Támogatási szerződés száma: TOP-4.1.1-15-KO1-2016-00012
 Kedvezményezett: Pilismarót Község Önkormányzata

Támogatást igénylő	Költségkategória	Költség típus	Megnevezés	Mennyiség	Nettó egységár (Ft)	Nettó összegára jutó AFA (Ft)	Összesen (Ft)	Nem elszámolható költség (Ft)
Pilismarót Község Önkormányzata	Projektelőkészítési költségei	Egyéb projektelőkészítéshez kapcsolódó költség	Műszaki tervek, kiviteli és tendertervek, ezek hatósági díjai	1	1 345 347	363 243	1 708 590	
Pilismarót Község Önkormányzata	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége	1	379 306	102 412	481 718	
Pilismarót Község Önkormányzata	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építés bekerülési értéke	1	33 926 869	9 160 255	43 087 124	18 871 968
Pilismarót Község Önkormányzata	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzés költségei	Bekerülési érték	1	210 630	56 870	267 500	
Dömös Község Önkormányzata	Projektelőkészítési költségei	Egyéb projektelőkészítéshez kapcsolódó költség	Műszaki tervek, kiviteli és tendertervek, ezek hatósági díjai	1	393 701	106 299	500 000	
Dömös Község Önkormányzata	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége	1	78 740	21 260	100 000	
Dömös Község Önkormányzata	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építés bekerülési értéke	1	5 227 912	1 411 536	6 639 448	2 025 326



Dömös Község Önkormányzata	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzés költségei	Bekerülési érték	1	1 858 702	501 850	2 360 552
Komárom-Esztergom Megyei Területfejlesztési Kft.	Projektelőkészítés költségei	Egyéb projektelőkészítéshez kapcsolódó költség	Egyéb szükséges háttéranyagok, szakvélemények költsége	1	700.000	0	700.000
Komárom-Esztergom Megyei Területfejlesztési Kft.	Projektelőkészítés költségei	Közbeszerzési költségek	Közbeszerzési szakértő díja, közbeszerzési dokumentáció összeállítása, közbeszerzési tanácsadói tevékenység	1	581 718	0	581 718
Komárom-Esztergom Megyei Területfejlesztési Kft.	Projektmenedzsment költség	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása	Személyi jellegű egyéb kifizetések	1	1 454 295	0	1 454 295
Komárom-Esztergom Megyei Területfejlesztési Kft.	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	1	290 859	0	290 859
Elszámolható költségek:							58 171 804
Nem elszámolható költségek:							20 897 294
PROJEKT TELJES KÖLTSÉGE:							79 069 098



Pilismarót Község Önkormányzata
Képviseletének elnöke



Közreműködő Szervezet
Börgöndi Szilárd
irodavezető

Kelt: Pilismarót, 2017. év július hónap ... napján

Kelt: Tatabánya, 2017. év július hónap ... napján

A PROJEKT FORRÁSAI

Támogatási szerződés száma: TOP-4.1.1-15-KO1-2016-00012

Kedvezményezett: Pilismarót Község Önkormányzata

Források	(Ft)
I. Saját forrás	0
I/1. a támogatást igénylő elszámolható hozzájárulása	0
I/2. partnerek hozzájárulása	0
I/3. bankhitel	0
I/4. egyéb, saját forrás kiegészítő támogatás	0
II. egyéb támogatás	0
III. a támogatási konstrukció keretében igényelt támogatás	58 171 804
Projekt elszámolható költsége	58 171 804
IV. a támogatást igénylő nem elszámolható hozzájárulása	20 897 294
Projekt teljes költsége összesen	79 069 098


 Pilismarót Község Önkormányzata
 Kedvezményezett


 P.H.

Kelt: Pilismarót, 2017. év július hónap ... napján


 Közreműködő Szervezet
 Börgöndi Szilárd
 irodavezető
 Tomasić Zoltánné
 osztályvezető

 P.H.

Kelt: Tatabánya, 2017. év július hónap ... napján



A PROJEKT MÉRFÖLDKÖVEI

Támogatási szerződés száma: TOP-4.1.1-15-KO1-2016-00012

Kedvezményezett: Pilismarót Község Önkormányzata

Mérföldkő sorszáma	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma	Megvalósítani tervezett eredmény leírása
1.	2017.09.30.	A megvalósítás első mérföldköve a projekt előkészítési dokumentáció teljes körű teljesítése. Benyújtásra kerül amennyiben releváns: Engedélyköteles beruházás esetén: a jogerős építési engedély és az engedélyező hatóság által elfogadott teljes engedélyezési szintű tervdokumentáció.-Tervezői/statikus nyilatkozatok, igazolások új épület építése/funkciójukat vesztt épületek hasznosítása/funkcióváltás esetén(amennyiben releváns)-Nyilatkozat a kiváltott ingatlan hasznosításáról(amennyiben releváns)-Beruházásra vonatkozó tervezői költségbecslés;Fajlagos költségkimutatás a mellékelt Excel táblázat alapján-Akadálymentesítésről szóló tervefezet: a tervdokumentáció mellé/külön fejezetként csatolni szükséges a rehabilitációs környezettervező szakmérnök/szakértő és a tervező közös fejezetét, nyilatkozatát az akadálymentesítésről(amennyiben releváns)-Energiatanúsítvány a megújításra kerülő épületről(amennyiben releváns). A Támogatói döntésben szereplő feltételeket az 1. mérföldkőig teljesítjük.
2.	2017.11.26.	A kiviteli tervek (amennyiben releváns) valamint a részletes tervezői költségvetés a támogatási szerződés hatályba lépésétől számított 12 hónapon belül benyújtásra kerül; -Tulajdonviszonyok rendezése (amennyiben releváns): A projekt megvalósítási helyszínére vonatkozó tulajdonjogi kérdéseket, adás-vételt, bérleti szerződést, per, teher- és igénymentesség igazolását, a kiváltott ingatlan tulajdoni lapja, stb. - Konzorciumi megállapodás támogatásban részesített projekt megvalósítására c. dokumentum véglegesítése (amennyiben releváns): Amennyiben a projekt konzorciumi formában valósul meg, legkésőbb a támogatási szerződés hatályba lépésétől számított 12 hónapon belül szükséges véglegesíteni a konzorciumban résztvevők körét és a megvalósításra vonatkozó konzorciumi megállapodást valamennyi konzorciumi tag által aláírni. -A kötelező nyilvánosság folyamatos biztosítása.
3.	2018.02.13.	A 3. mérföldkő keretében a TSZ hatályba lépésétől számított 18 hónapon belül a teljes közbeszerzési eljárás lefolytatásra és lezárásra kerül. Az eljárás eredményesen, nyertes ajánlattevő kihirdetésével zárul. -A kötelező nyilvánosság folyamatos biztosítása.

4.	2018.06.30.	Az 50%-os készütségi fok alátámasztását igazoló dokumentumok, valamint kifizetési kérelem benyújtása a közreműködő szervezethez. Kötelező nyilvánosság folyamatos biztosítása.
5.	2018.09.30.	A 100%-os készütségi fok alátámasztását igazoló dokumentumok, valamint kifizetési kérelem benyújtása a közreműködő szervezethez. Kötelező nyilvánosság folyamatos biztosítása.
6.	2018.10.31.	Eredményességmérési keret indikátor teljesítése: Tekintettel arra, hogy a felhívás eredményességmérési keretre vonatkozó indikátor teljesítését is előírja, az indikátorhoz tartozó tevékenység – valamint az indikátor célérték – teljesüléséről a kedvezményezettnek az adott tevékenység megvalósításáról jelentést kell tennie. Benyújtásra kerülő dokumentumok: a vonatkozó indikátor adatlapján megjelölt igazolás. Kötelező nyilvánosság folyamatos biztosítása.
7.	2018.12.31.	Benyújtandó dokumentumok: műszaki ellenőr beszámolója, fotódokumentáció, teljesítésigazolások, egyéb projektzárást igazoló dokumentumok, záró kifizetési igénylés összeállítása.


Pilismarót Község Önkormányzata
Kedvezményezett



Kelt: Pilismarót, 2017. év július hónap 19. napján

Közreműködő Szervezet

Börgöndi Szilárd
irodavezető



Tomasik Zoltánné
osztályvezető

Kelt: Tatabánya, 2017. év július hónap 18. napján

Handwritten blue scribbles at the bottom left corner of the page.

A PROJEKT MŰSZAKI-SZAKMAI TARTALMA ÉS EREDMÉNYEI

Támogatási szerződés száma: TOP-4.1.1-15-KO1-2016-00012
Kedvezményezett: Pilismarót Község Önkormányzata

Mérföldkő sorszáma	Eredmény megnevezése	Eredmény leírása	Eredmény számszerűsítendő célértéke	Eredmény számszerűsítendő célértékének mértékegysége	Az eredmény nem számszerűsíthető, egyéb tulajdonsága
7	Támogatási kérelem adatlapján szereplő részletes műszaki szakmai leírásban található. Pilismarót: Háziorvosi, fogorvosi és védőnői rendelők kialakítása, átalakítása, felújítása, akadálymentesítése, szolgálati lakás átalakítása. Döms: Háziorvosi és védőnői rendelők felújítása.	A projekt műszakilag megvalósításra kerül, melynek keretében a pilismaróti és dömösi rendelők felújítása, átalakításra kerülnek.	2	db	A pilismaróti és dömösi fejlesztésekkel javulna a közszolgáltatásokhoz való hozzáférés pl. az akadálymentesítés révén, az épületek rendbeyondzata, és – pl. Pilismaróton – az egyes egészségügyi szolgáltatások jellemzőihez való jobb illeszkedés, a modernebb háziorvosi, védőnői eszközpark fokozhatja az igénybevételi hajlandóságot, akár a szűrővizsgálatokat is tekintve. Így növekedhet az egészségben eltöltött évek száma is.

.....
Pilismarót Község Önkormányzata
Kedvezményezett

Juraj

Kelt: Pilismarót, 2017. év július hónap ... napján



.....
Közreműködő Szervezet

Tomasik

Tomasik Zoltánné
osztályvezető

Börgöndi Szilárd
irodavezető

Kelt: Tatabánya, 2017. év július hónap ... napján



Handwritten mark

A PROJEKT INDIKÁTORAI



Támogatási szerződés száma: TOP-4.1.1-15-KO1-2016-00012
 Kedvezményezett: Pilismarót Község Önkormányzata

A Projektre vonatkozó output indikátor és elvárt célértéke:

Monitoring mutató megnevezése	Bázisérték dátuma	Bázisérték	Cél dátuma	Cél változás	Cél összváltozás	Cél kumulált
Fejlesztéssel érintett egészségügyi alapellátást nyújtó szolgálatok (benne: házi gyermekorvos, fogorvos, védőnői szolgálat és kapcsolódó ügyeleti ellátás, iskola- egészségügyi ellátás) száma	-	-	2018.10.31	6	6	6
Fejlesztéssel érintett egészségügyi alapellátást nyújtó szolgálatok (benne: házi gyermekorvos, fogorvos, védőnői szolgálat és kapcsolódó ügyeleti ellátás, iskola- egészségügyi ellátás) száma	-	-	2018.12.31	0	6	6
Fejlesztéssel érintett egészségügyi alapellátást nyújtó szolgálatok (benne: házi gyermekorvos, fogorvos, védőnői szolgálat és kapcsolódó ügyeleti ellátás, iskola- egészségügyi ellátás) száma	-	-	2019.12.31	0	6	6
Fejlesztéssel érintett egészségügyi alapellátást nyújtó szolgálatok (benne: házi gyermekorvos, fogorvos, védőnői szolgálat és kapcsolódó ügyeleti ellátás, iskola- egészségügyi ellátás) száma	-	-	2020.12.31	0	6	6
Fejlesztéssel érintett egészségügyi alapellátást nyújtó szolgálatok (benne: házi gyermekorvos, fogorvos, védőnői szolgálat és kapcsolódó ügyeleti ellátás, iskola- egészségügyi ellátás) száma	-	-	2021.12.31	0	6	6
Fejlesztéssel érintett egészségügyi alapellátást nyújtó szolgálatok (benne: házi gyermekorvos, fogorvos, védőnői szolgálat és kapcsolódó ügyeleti ellátás, iskola- egészségügyi ellátás) száma	-	-	2022.12.31	0	6	6
Fejlesztéssel érintett egészségügyi alapellátást nyújtó szolgálatok (benne: házi gyermekorvos, fogorvos, védőnői szolgálat és kapcsolódó ügyeleti ellátás, iskola- egészségügyi ellátás) száma	-	-	2023.12.31	0	6	6
Jobb egészségügyi szolgáltatásokban részesülő lakosság	-	-	2018.12.31	3 279	3 279	3 279
Jobb egészségügyi szolgáltatásokban részesülő lakosság	-	-	2019.12.31	0	3 279	3 279




Jobb egészségügyi szolgáltatásokban részesülő lakosság	-	-	2020.12.31	0	3 279	3 279
Jobb egészségügyi szolgáltatásokban részesülő lakosság	-	-	2021.12.31	0	3 279	3 279
Jobb egészségügyi szolgáltatásokban részesülő lakosság	-	-	2022.12.31	0	3 279	3 279
Jobb egészségügyi szolgáltatásokban részesülő lakosság	-	-	2023.12.31	0	3 279	3 279
Újonnan épített vagy felújított rendelők, tanácsadók száma	-	-	2018.12.31	2	2	2
Újonnan épített vagy felújított rendelők, tanácsadók száma	-	-	2019.12.31	0	2	2
Újonnan épített vagy felújított rendelők, tanácsadók száma	-	-	2020.12.31	0	2	2
Újonnan épített vagy felújított rendelők, tanácsadók száma	-	-	2021.12.31	0	2	2
Újonnan épített vagy felújított rendelők, tanácsadók száma	-	-	2022.12.31	0	2	2
Újonnan épített vagy felújított rendelők, tanácsadók száma	-	-	2023.12.31	0	2	2

.....
 Pilismarót Község Önkormányzata
 Képviseletének elnöke


 Kelt: Pilismarót, 2017. év július. hónap .. napján

.....
 Közreműködő Szervezet
 Börgöndi Szilárd
 irodavezető


 Kelt: Tatabánya, 2017. év július hónap .. napján

BIZTOSÍTÉKOKRA VONATKOZÓ NYILATKOZATOK, SZERZŐDÉSEK, MEGÁLLAPODÁSOK

Alulírott **Pergel István Csaba** polgármester, mint **Pilismarót Község Önkormányzatának** (2028 Pilismarót, Rákóczi u. 15.) aláírásra jogosult képviselője nyilatkozom, hogy a TOP-4.1.1-15 keretében megvalósuló „Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése Pilismarót és Dömös községben” című, TOP-4.1.1-15-KO1-2016-00012 azonosító számú projekttel kapcsolatban a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 84. §. (1) bekezdés c) pontja alapján önkormányzatunk mentesül a biztosítéknyújtási kötelezettség alól.

Kelt: Pilismarót, 2017. év július hónap 14. napján

Pilismarót Község Önkormányzata
Kedvezményezett



BIZTOSÍTÉKOKRA VONATKOZÓ NYILATKOZATOK, SZERZŐDÉSEK, MEGÁLLAPODÁSOK

Alulírott **dr. Juhász János**, mint a **Komárom-Esztergom Megyei Területfejlesztési Korlátolt Felelősségű Társaság**, 2800 Tatabánya, Fő tér 4. aláírásra jogosult képviselője nyilatkozom, hogy a TOP-4.1.1-15 keretében megvalósuló „Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése Pilismarót és Dömös községben” című, TOP-4.1.1-15-KO1-2016-00012 azonosító számú projekttel kapcsolatban a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 84. §. (1) bekezdés g) pontja alapján társaságunk mentesül a biztosítéknyújtási kötelezettség alól.

Kelt: Tatabánya, 2017. év július hónap ¹⁷ napján

.....
Komárom-Esztergom Megyei Területfejlesztési Kft.
Kedvezményezett

P.H.

Komárom-Esztergom Megyei
Területfejlesztési Kft.
2800 Tatabánya, Fő tér 4.
Adószám: 25390676-2-11

Handwritten signature

BIZTOSÍTÉKOKRA VONATKOZÓ NYILATKOZATOK, SZERZŐDÉSEK, MEGÁLLAPODÁSOK

Alulírott **Herman Jenőné** polgármester, mint **Dömös Község Önkormányzatának** (2027 Dömös, Táncsics M. u. 2.) aláírásra jogosult képviselője nyilatkozom, hogy a TOP-4.1.1-15 keretében megvalósuló „Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése Pilismarót és Dömös községben” című, TOP-4.1.1-15-KO1-2016-00012 azonosító számú projekttel kapcsolatban a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 84. §. (1) bekezdés c) pontja alapján önkormányzatunk mentesül a biztosítéknyújtási kötelezettség alól.

Kelt: Dömös, 2017. év július hónap 17 napján


Dömös Község Önkormányzata
Kedvezményezett



KONZORCIUMI EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

Támogatásban részesített projekt megvalósítására

1. Preambulum

A Pilismarót Község Önkormányzata, a Komárom-Esztergom Megyei Területfejlesztési Korlátolt Felelősségű Társaság és a Dömös Község Önkormányzata Konzorcium (a továbbiakban Konzorcium) a(z) TOP-4.1.1-15-KO1 - Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése Operatív Program tárgyú felhívására TOP-4.1.1-15-KO1-2016-00012 azonosító számon regisztrált támogatási kérelmet nyújtott be, amelyet a Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Program Irányító Hatósága (a továbbiakban: Támogató) a 2017.06.13-án kelt támogatói döntése alapján támogatásban részesített.

A projekt címe: „Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése Pilismarót és Dömös községben” (továbbiakban Projekt), amelynek megvalósítására a Támogató támogatási szerződést köt a Konzorciummal.

A Projekt megvalósítására a Konzorcium tagjai az alábbi konzorciumi együttműködési megállapodást (a továbbiakban Megállapodás) kötik:

2. Szerződő felek

A Konzorcium tagjai (a továbbiakban együtt Tagok):

Szervezet neve:	Pilismarót Község Önkormányzata
Postacím:	2028 Pilismarót, Rákóczi u. 15.
Székhely:	2028 Pilismarót, Rákóczi u. 15.
Azonosító szám (törzs-szám/cégjegyzékszám):	729819
Adószám:	15729813-2-11
Aláírásra jogosult képviselője:	Pergel István Csaba
Számlavezető neve:	Raiffeisen Bank Zrt.
Számlaszám:	12025000-00208790-00100003

Szervezet neve:	Komárom-Esztergom Megyei Területfejlesztési Korlátolt Felelősségű Társaság
Postacím:	2800 Tatabánya, Fő tér 4.
Székhely:	2800 Tatabánya, Fő tér 4.
Azonosító szám (törzsszám/cégjegyzékszám):	11-09-023969
Adószám:	25390676-2-11
Aláírássra jogosult képviselője:	Dr. Juhász János ügyvezető
Számlavezető neve:	Pannon Takarékszövetkezet Zrt.
Számlaszám:	63200133-11075985-00000000

Szervezet neve:	Dömös Község Önkormányzata
Postacím:	2027 Dömös, Táncsics M. u. 2.
Székhely:	2027 Dömös, Táncsics M. u. 2.
Azonosító szám (törzsszám/cégjegyzékszám):	729996
Adószám:	15729992-2-11
Aláírássra jogosult képviselője:	Herman Jenőné
Számlavezető neve:	K&H Bank Zrt.
Számlaszám:	10403648-00027591-00000002

A Konzorcium Tagjai maguk közül a 2017. június 13-án kelt „Konzorciumi együttműködési megállapodás támogatási kérelem benyújtására” dokumentum alapján Pilismarót Község Önkormányzata Tagot választották a Konzorcium vezetőjévé (továbbiakban Konzorciumvezető). A Konzorciumvezető személyét a Tagok jelen Konzorciumi Együttműködési Megállapodással megerősítik.

A Konzorciumvezető a Projekt megvalósítása, valamint a Konzorcium fenntartása és megfelelő működtetése érdekében koordinálja a Konzorcium működését.

3. A Tagok jogai és kötelezettségei

3.1. A Megállapodás aláírásával a Tagok kijelentik, hogy a Támogató által a Konzorciumvezető részére megküldött támogatási szerződés tervezet rendelkezéseit és annak mellékleteit ismerik, azt magukra nézve kötelezőnek ismerik el, továbbá tudomásul veszik, hogy az abban foglalt kötelezettségek minden Tagra nézve kötelező érvényűek.

A Megállapodás aláírása kifejezi továbbá a Tagok azon szándékát is, hogy a Projekt befejezését követően a Projektben meghatározott célok megvalósítása érdekében a támogatási kérelemben és a támogatási szerződésben leírtaknak megfelelően a fenntartási időszakban is együttműködnek, és az addig elért eredmények további folyamatos fenntartását saját anyagi eszközeikkel biztosítják.

A Tagok a Megállapodás aláírásával a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:11. §-a és 6:15. §-a alapján meghatalmazzák a Konzorciumvezetőt, hogy a támogatási szerződést, és annak esetleges módosításait, valamint a kifizetési igénylés részeként benyújtandó dokumentumokat nevükben és helyettük benyújtsa. A tagok nevére szóló benyújtandó dokumentumokat a tagok kötelesek megfelelően aláírni, illetve a jogszabályban meghatározott esetekben záradékolni.

Az előzőekben nem szereplő egyéb nyilatkozatok megtétele előtt a Konzorciumvezető biztosítja, hogy a Tagok a nyilatkozat tartalmát megismerjék és elfogadják olyan időben, hogy a nyilatkozatot a Támogató jogszabályban vagy támogatási szerződésben meghatározott határidőben megkapja.

Amennyiben a támogatási szerződés módosítását eredményező, a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet) 86. § (1) bekezdése szerinti körülmény merül fel, a Tagok kötelesek azt a Konzorciumvezetőnek jelezni, illetve egyeztetni egymással a módosítás kérelmezését megelőzően. A Konzorciumvezető köteles biztosítani, hogy a Tagok a Támogató által küldött támogatási szerződés módosításának tervezetét előzetesen elfogadják.

A támogatási szerződésben rögzített kötelezettségek a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet eltérő rendelkezésének hiányában a projekt szintjén értendők.

A Konzorciumvezető a Megállapodás aláírásával kötelezettséget vállal arra, hogy a támogatási szerződés másolatát és annak esetleges módosításainak másolatát a támogatási szerződés mindkét fél által aláírt példányának kézhezvételét követő 5 munkanapon belül megküldi a Tagoknak.

3.2. A Tagok a Projekt megvalósítása során kötelesek együttműködni, egymás, a jelen Megállapodásban, illetve a támogatási kérelemben vállalt kötelezettségeinek teljesítését elősegíteni, a teljesítéshez szükséges információt megadni.

A Konzorciumvezető kötelezi magát arra, hogy a Támogatónak, és a Projekt megvalósításának ellenőrzésére jogszabály és a támogatási szerződés alapján jogosult szervezeteknek a Projekt megvalósításával kapcsolatos bármilyen közléséről a Tagokat tájékoztatja.

A Tagok kötelesek tájékoztatni a Konzorciumvezetőt, ha a Projekt keretében általuk vállalt tevékenység megvalósítása akadályba ütközik, meghiúsul, vagy késedelmet szenved, illetve bármely olyan körülményről, amely a Projekt megvalósítását befolyásolja.

Handwritten signature

A költségvetést érintő változások bejelentését, valamint az azt alátámasztó dokumentációt a tagonként meghatározott támogatási összegre vonatkozóan a Tag maga készíti el a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet szerinti elektronikus alkalmazások segítségével, és továbbítja a Konzorciumvezetőnek, aki – szükség esetén – a projektszintű dokumentumokon átvezeti a változást és benyújtja a Támogatónak, mellékelve a Tag által elkészített dokumentációt.

A Tagok közötti költségátcsoportosítás a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 86. §-ában, a támogatási szerződés módosítására vonatkozó előírások szerint kezdeményezhető.

Amennyiben a Támogató a Projekttel kapcsolatban tájékoztatást kér a Konzorciumvezetőtől, a Konzorciumvezető felhívására a Tagok kötelesek a Projekt keretében általuk vállalt tevékenységről a megfelelő információt olyan határidőben megadni, hogy a Konzorciumvezető a Támogató által megszabott határidőben a kért tájékoztatást megadhassa.

3.3. A Projekt megvalósítása érdekében a Tagok az alábbi tevékenységek megvalósítását vállalják, a Projektben foglalt tevékenységekkel, mérföldkövekkel, műszaki-szakmai tartalommal, illetve költségvetéssel összhangban:

	Tag neve	Tevékenység	A tevékenységre jutó elszámolható költség összege	A tevékenységre jutó támogatás összege
1.	Pilismarót Község Önkormányzata	Műszaki tervek, kiviteli és tendertervek, ezek hatósági díjai	1 708 590	1 708 590
2.	Pilismarót Község Önkormányzata	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége	481 718	481 718
3.	Pilismarót Község Önkormányzata	Építéshez kapcsolódó költségek	43 087 124	43 087 124
4.	Pilismarót Község Önkormányzata	Eszközbeszerzés költségei	267 500	267 500
5.	Dömös Község Önkormányzata	Műszaki tervek, kiviteli és tendertervek, ezek hatósági díjai	500 000	500 000
6.	Dömös Község Önkormányzata	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége	100 000	100 000
7.	Dömös Község Önkormányzata	Építéshez kapcsolódó költségek	6 639 448	6 639 448
8.	Dömös Község Önkormányzata	Eszközbeszerzés költségei	2 360 552	2 360 552
9.	Komárom-Esztergom Megyei Területfejlesztési Kft.	Egyéb szükséges háttéranyagok, szakvélemények költsége	700.000	700.000
10.	Komárom-Esztergom Megyei Területfejlesztési Kft.	Közbeszerzési szakértő díja, közbeszerzési dokumentáció összeállítása, közbeszerzési tanácsadói tevékenység	581 718	581 718

Handwritten signatures and initials in blue ink.

11.	Komárom-Esztergom Megyei Területfejlesztési Kft.	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása	1 454 295	1 454 295
12.	Komárom-Esztergom Megyei Területfejlesztési Kft.	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	290 859	290 859

A Tagok felelnek az általuk vállalt, jelen pontban részletezett feladatoknak az elvégzéséért.

3.4. Az egyes Tagok által a Projekt keretében elszámolható költség összegét és az arra jutó támogatást, valamint az igényelt előleg összegét a következő táblázat tartalmazza.

	Tag neve	Elszámolható költség	Támogatási összeg	Igényelt előleg
1.	Pilismarót Község Önkormányzata	45 544 932	45 544 932	45 544 932
2.	Dömös Község Önkormányzata	9 600 000	9 600 000	9 600 000
3.	Komárom-Esztergom Megyei Területfejlesztési Kft.	3 026 872	3 026 872	1 513 436

3.5. A Tagok a Projekt megvalósításához az alábbi önrészt adják, amely összesen a Projekt elszámolható költségének 35,923407 %-kát képezi, az alábbi megoszlásban:

	Tag neve	önrész formája	önrész összege	részesedése a projekt elszámolható költségéhez képest (%)
1.	Pilismarót Község Önkormányzata	számlapénz	18 871 968	32,441779
2.	Dömös Község Önkormányzata	számlapénz	2 025 326	3,481628
3.	Komárom-Esztergom Megyei Területfejlesztési Kft.	nem releváns	nem releváns	nem releváns

3.6. A támogatás igényléséhez szükséges, a Projekt előrehaladásáról és eredményeiről szóló információkat is szakmai beszámoló formájában tartalmazó, a támogatási szerződésben rögzített mérföldkövekhez kötött kifizetési igényléseket, a záró kifizetési igénylést és projekt fenntartási jelentéseket (továbbiakban együtt beszámoló) a Konzorcium nevében a Konzorciumvezető állítja össze a monitoring és információs rendszerben, és azon keresztül küldi meg a Támogatónak.

A Tagok a Projekt keretében általuk vállalt tevékenységek előrehaladásáról, a kapcsolódó költségek elszámolásáról a támogatási szerződésben meghatározott mérföldkövek elérésekor kötelesek a szükséges információkat rögzíteni a monitoring és információs rendszerben, és kötelesek csatolni a támogatási szerződésben előírt mellékleteket.

Handwritten signature

Handwritten signature

Mérföldkövek közötti kifizetési igénylést bármely Tag kezdeményezhet a szükséges információknak a monitoring és információs rendszerben történő rögzítésével. A mérföldkövek közötti kifizetési igénylésnek nem része az előbbieket szerinti részletes szakmai beszámoló, ebben az esetben csak egy rövid összefoglalót szükséges adni a kifizetési igénylésben a projekt adott taghoz kötődő tevékenységeinek előrehaladásáról. A mérföldkövek közötti kifizetési igénylést a konzorciumi tag döntése alapján benyújthatja mind a tag, mind pedig a Konzorciumvezető.

A Támogató felé benyújtásra kerülő mérföldkövek közötti kifizetési igénylésnek el kell érnie a kifizetési kérelmek benyújtására a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben és a Támogatási Szerződésben/Támogatói Okiratban meghatározott korlátokat.

A Tagok tudomásul veszik, hogy a kifizetési igényléshez tartozó, általuk benyújtott elszámoló bizonylatokra jutó, a Támogató által jóváhagyott támogatást a Támogató közvetlenül utalja a 2. pontban megjelölt, és ez alapján a monitoring és információs rendszerben rögzített bankszámlákra.

A Támogató legfeljebb annak a támogatási mértéknek, illetve összegnek megfelelő támogatást utal összesen a Tag részére, amelyet a felhívás, illetve a támogatásról szóló döntés az adott Tag vonatkozásában maximálisan meghatározott.

Amennyiben az esedékes támogatás folyósítását megelőző ellenőrzés alapján megállapítható, hogy a Tagoknak lejárt esedékességű, meg nem fizetett köztartozása van, a Támogató az adott Tagra jutó támogatás folyósítását felfüggeszti.

Amennyiben a projekt végrehajtása során a soron következő mérföldkö határidejét, vagy a mérföldköben vállalt eredményeket nem tudják a tagok teljesíteni, addig nem teljesíthető kifizetés,

ameddig a mérföldkö tartalma projekt szinten nem teljesül, vagy a projekt ütemezését a Konzorciumvezető a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 86-87. §-aiban foglaltaknak megfelelően nem módosítja.

Amennyiben a Támogató szabálytalanság vagy a támogatási szerződés megszegése miatt már kifizetett támogatás visszafizetését rendeli el, a Tag köteles az általa okozott szabálytalanság vagy szerződésszegés miatt visszakövetelt összeget közvetlenül a Támogató részére visszafizetni, az erre irányuló felszólításában foglaltak szerint.

Ha nem állapítható meg, hogy a szabálytalanság elkövetésében vagy a támogatási szerződés megszegésében a Tagok milyen mértékben működtek közre, és a Tagok a visszafizetési kötelezettségüket a visszafizetési felszólításban meghatározott időpontig nem teljesítik, a támogató a követelése teljes összegét bármely Taggal szemben érvényesítheti.

3.7. A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 1. számú mellékletének 76.1. pontja szerint minden konzorciumi tagnak nyújtania kell a kötelező biztosítékokat, ha a ráeső támogatási összeg meghaladja a 20 millió forintot és a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 84.§-a szerint nem mentesül a biztosítékkadási kötelezettség alól.

A konzorciumi tagok a biztosítéknyújtási kötelezettséget átvállalhatják.

A biztosítékokkal kapcsolatos nyilatkozatokat, szerződéseket stb. a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben és a támogatási szerződésben meghatározott időpontban kötelesek a Tagok a monitoring és információs rendszerben rögzíteni, illetve a szükséges dokumentumokat csatolni, azok a Konzorciumvezető általi projektszintű benyújtással kerülnek a Támogató részére megküldésre.

3.8. A Konzorciumra vonatkozó speciális szabályokat a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 140. §-a tartalmazza.

Handwritten signature or initials in blue ink.

Handwritten signature or initials in blue ink.

A Konzorcium fenntartása és megfelelő működtetése a Konzorciumvezető kötelezettsége, amelyek az elmulasztásából eredő károkért a Támogató irányában a Konzorciumvezető tartozik felelősséggel.

A Konzorcium fenntartása és megfelelő működtetése körében a Konzorciumvezető a támogatási szerződésben meghatározott cél elérése érdekében összehangolja a Tagok tevékenységét és szervezi a konzorcium munkáját. Ez a rendelkezés nem érinti a Tagok jelen Megállapodás alapján vállalt kötelezettségeikért való egymással szemben fennálló felelősségét.

3.9 A Konzorcium valamely tagja által a Konzorcium nevében kötött szerződésért a tagok felelőssége egyetemleges, kivéve, ha ettől eltérően rendelkeznek.

4. Kapcsolattartás

A Tagok a Megállapodás, valamint a támogatási szerződés teljesítésének időtartamára kapcsolattartókat jelölnek ki. A kapcsolattartó nevééről, postacíméről, telefon és telefax-számáról, elektronikus levélcíméről a Tagok a jelen Megállapodás aláírását követően öt munkanapon belül tájékoztatják a Konzorciumvezetőt. A Konzorciumvezető a kapcsolattartók nevééről és elérhetőségéről tájékoztatja a Tagokat.

A kijelölt kapcsolattartók negyedévente legalább egy alkalommal szóbeli egyeztetést tartanak, amelyen megvitatják a Projekt megvalósításának előrehaladásával kapcsolatos teendőket. A szóbeli egyeztetést a Konzorciumvezető kijelölt kapcsolattartója hívja össze. A szóbeli egyeztetésről emlékeztetőt kell készíteni, amelyet a Konzorciumvezető kijelölt kapcsolattartója az egyeztetést követő öt munkanapon belül megküld a Tagok kijelölt kapcsolattartója részére. Az emlékeztető a projektdokumentáció része, amelyet a Támogató jogosult ellenőrizni.

5. A Konzorcium képviselése

A Konzorciumot a Támogató felé a Konzorciumvezető, más, harmadik személyek felé a Tagok eltérő megállapodása hiányában a Konzorciumvezető képviseli. Jogszabály alapján ellenőrzésre jogosult szervek felé a Tag törvényes képviselője a Tagot önállóan képviselheti. Az ellenőrzésről köteles a Konzorciumvezetőt értesíteni, aki a Tag székhelyén vagy telephelyén lefolytatott helyszíni ellenőrzés során jelen lehet. Amennyiben a Projekttel kapcsolatban harmadik személyek bármely Tagtól tájékoztatást kérnek, a Tag köteles erről előzetesen, a tájékoztatás megadása előtt értesíteni a Konzorciumvezetőt.

6. A beszerzett eszközök és más dolgok tulajdonjoga, illetve egyéb jogok

A támogatás felhasználásával a projekt megvalósítása során beszerzett, illetve létrejövő dolgok és egyéb jogok feletti rendelkezés az alábbiak szerint kerül meghatározásra:

7. A tagság megszűnése, a tagok körének változása

7.1. A Tag jelen Megállapodás aláírásával megerősíti, hogy a Projekt megvalósításában részt kíván venni, a projektet a támogatási kérelemben meghatározott módon megvalósítja, annak megvalósítása során fokozottan együttműködik a többi Taggal, és a Konzorciumból csak abban az esetben lép ki, ha a támogatási szerződésben és a jelen Megállapodásban vállalt kötelezettségeinek teljesítésére a jelen Megállapodás aláírását követően, neki fel nem róható okból beállott körülmény folytán nem képes.

7.2. Konzorciumi tagok cseréje - ide értve a támogatási kérelmet benyújtó Konzorciumvezető személyét is -, új konzorciumi tag bevonása, konzorciumi tag kilépése akkor engedélyezhető, ha

- a) nem változik a projekt alapvető célja,
- b) a tagcsere, illetve a tagok számának bővülése esetén az új tag is megfelel a felhívásban meghatározott valamennyi feltételnek és benyújtásra kerülnek a projektgazdák számára előírt dokumentumok,
- c) a konzorciumvezető kilépési szándéka esetén a kilépést megelőzően a konzorciumvezetői pozíció átadása megtörténik,
- d) a tag kilépése esetén nem változik a konzorciumnak a projektjavaslat benyújtására vonatkozó jogosultsága - ideértve a konzorciumvezetőre vonatkozó feltételeknek való megfelelést is -, kivéve, ha az új kedvezményezett jogszabályon alapuló kötelező jogutódlás következtében lép be a támogatási jogviszonyba,
- e) a tag kilépése esetén a tag igazolja, hogy a támogatási szerződésben és a konzorciumi megállapodásban vállalt kötelezettségeinek teljesítésére a megállapodás aláírását követően, neki fel nem róható okból beállott körülmény folytán nem képes,
- f) kizárás esetén a konzorciumvezető igazolja, hogy a tag tevékenysége, működése a projekt megvalósítását pénzügyi, illetve szakmai szempontból veszélyezteti,
- g) tagcsere nélkül új tag bevonása indokolt.

7.3. A Konzorcium a kizárásra irányuló indítvánnyal nem érintett tagok egyhangú döntésével jogosult kizárni azt a Tagot, akinek tevékenysége, működése a Projekt megvalósítását akár pénzügyi, akár szakmai szempontból veszélyezteti.

A kizárásról született írásos, a Tagok által aláírt határozatot a Konzorciumvezető köteles megküldeni a Támogatónak.

7.4. Valamely Tag kilépése, kizárása vagy jogutód nélküli megszűnése nem eredményezi a jelen Megállapodás és a Konzorcium megszűnését, kivéve, ha ennek következtében a Tagok a támogatási szerződésben és a jelen Megállapodásban vállalt kötelezettségeik teljesítésére nem képesek, és emiatt a támogatási szerződéstől elállnak.

7.5. Ha a kilépő vagy jogutód nélkül megszűnő Tag által vállalt kötelezettségeket a megmaradó Tagok nem tudják teljesíteni, új Tag bevonásáról határozhatnak. A belépő Tag csak olyan szervezet, illetve személy lehet, amely, illetve aki megfelel a felhívásban foglalt követelményeknek.

7.6. A Tag kilépése, illetve kizárása esetén köteles egyeztetést kezdeményezni a Konzorciumvezetővel a Projekt céljának elérése érdekében. A Konzorciumból kiváló Tag köteles a Konzorciumvezetőnek a kiválás időpontját megelőzően a rábízott anyagi eszközökkel és a Projekt kapcsán felmerült költségekkel hiánytalanul, tételesen írásban elszámolni, valamint az általa elvégzett tevékenységről és az elvállalt, de kiválásáig el nem végzett tevékenységekről beszámolni. Köteles továbbá a – a Megállapodás keretében esetlegesen – használatába kapott vagyontárgyat a Konzorciumvezetőnek haladéktalanul, ellenszolgáltatás nélkül visszaszolgáltatni. Az átadás-átvétellel jegyzőkönyvet kell készíteni, amelyet a Konzorciumvezető, a kilépő Tag és az átvétellel érintett Tag ír alá.

SRM

for

17 Jan

A Konzorciumból kiváló Tagot a kilépést vagy kizárást követően is, a támogatási szerződés megszűnéséig terheli a támogatási szerződésben meghatározott dokumentum-megőrzési kötelezettség, ellenőrzés-tűrési kötelezettség, a kiválás időpontjáig megvalósult tevékenységekkel és benyújtott dokumentumokkal kapcsolatos szabálytalanságokért való helytállás.

A kilépő Tag tulajdonába került, támogatásból vásárolt vagyont valamely Tag tulajdonába kell adni, illetve, ha ez nem lehetséges, vagy a Tagok nem kívánják, a megmaradó Tagok ingyenes használatába kell adni. Ha az ingyenes használatba adás nem valósulhat meg, akkor a fejlesztés során létrejött vagyona jutó támogatást a kilépő tag köteles visszafizetni a támogatási szerződésben visszafizetésre meghatározottak szerint, az abban foglalt feltételekkel a Támogató részére.

7.7. A 7.1 - 7.6. pontban foglalt jogok gyakorlása a jelen Megállapodás módosítását igényli, amelyhez a Támogató hozzájárulása szükséges. A hozzájárulást a támogatási szerződés kedvezményezett általi módosítására előírt szabályok szerint kell kérelmezni a Támogatótól.

8. A Megállapodás megszűnése és módosítása

8.1. Jelen Megállapodás a támogatási szerződés elválaszthatatlan részét képezi, és osztja annak jogi sorsát. Ennek értelmében a támogatási szerződés megszűnése jelen Megállapodás megszűnését vonja maga után.

8.2. Jelen Megállapodás megszűnik, ha a Tagok száma a felhívásban megadott minimális tagszám alá, illetve egyre csökken.

8.3. A Megállapodás Támogató által meghatározott kötelező tartalma csak írásban módosítható, melyhez a Támogató hozzájárulása szükséges. A hozzájárulást a támogatási szerződésben a támogatási szerződés kedvezményezett általi módosítására előírt szabályok szerint kell kérelmezni a Támogatótól.

A Tagok adataiban bekövetkezett változások, így különösen székhely, bankszámlaszám, stb., nem igénylik a Megállapodás módosítását. Az adatok változásáról a Tagok haladéktalanul értesítik a Konzorciumvezetőt. A Konzorciumvezető ezekről a változásokról értesíti a monitoring és információs rendszeren keresztül a Támogatót, a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 86. §-ának megfelelően.

8.4. A jogviszonyra és a Projekt megvalósítási kötelezettségére tekintettel a Tagok a felmondás jogát kizárják.

9. A Tagok egyéb megállapodásai

9.1. A Tagok megállapodnak, hogy amennyiben a Támogató álláspontja alapján nem állapítható meg, hogy egy esetleges szabálytalanság elkövetésében vagy a támogatási szerződés megszegésében a Tagok milyen mértékben működtek közre, úgy felelősségük egymást között a az egyes Tagok által a Projekt keretében elszámolható költségréz teljes elszámolható összköltséghez viszonyított arányához igazodik.

9.2. A Konzorcium bármely Tagja által a Projekt megvalósításához kapcsolódóan a Konzorcium nevében kötött szerződésért vagy vállalt kötelezettségért való felelősség - a 3.9. pontban rögzítettektől eltérően - kizárólagosan az adott Tagot terheli, a Felek az egyetemleges felelősséget ezúton kizárják.

10. Záró rendelkezések

10.1. Jelen Megállapodás 10 oldalon és 3 db eredeti példányban készült. A Megállapodás a támogatási szerződés elválaszthatatlan részét képezi.






10.2. A jelen Megállapodás hatályba lépésének napja megegyezik a Tagok közül az utolsóként aláíró aláírásának napjával. A Konzorciumvezető a Megállapodás hatályba lépését követően a Megállapodást megküldi a Támogató részére.

10.3. Jelen Megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó magyar jogszabályok rendelkezései az irányadók

10.4. A Tagok képviselőiben aláíró személyek kijelentik és cégkivonatukkal, valamint aláírási címpéldányaikkal igazolják, hogy a jelen Megállapodás 2. pontjában feltüntetettek szerint jogosultak a Tag képviselőre, továbbá ennek alapján a jelen Megállapodás megkötésére és aláírására. Aláíró képviselők kijelentik továbbá, hogy a testületi szerveik részéről a jelen Megállapodás megkötéséhez szükséges felhatalmazásokkal rendelkeznek, tulajdonosaik a támogatási jogügyletet jóváhagyták és harmadik személyeknek semminemű olyan jogosultsága nincs, mely a Tag részéről megakadályozná vagy bármiben korlátozná a jelen Megállapodás megkötését, és az abban foglalt kötelezettségek maradéktalan teljesítését.

10.5. Jelen Megállapodáshoz kapcsolódó jogviták esetére Tagok a Tatabányai Járásbíróság illetékességét kötik ki.

A Tagok a Megállapodást átolvásták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták.

<p>Konzorcium Vezetője</p> <p></p> <p>.....</p> <p>polgármester</p> <p>Pilismarót Községi Önkormányzat</p> <p></p> <p>P.H.</p> <p>Aláírás dátuma: 2017. július.....</p>	<p>Konzorciumi Tag</p> <p></p> <p>.....</p> <p>dr. Juhász János ügyvezető</p> <p>Komárom-Esztergom Megyei Területfejlesztési Kft.</p> <p>Komárom, Fő tér 4. Adószám: 25390676-2-11</p> <p>P.H.</p> <p>Aláírás dátuma: 2017. július ...17...</p>
<p>Konzorciumi Tag</p> <p></p> <p>.....</p> <p>polgármester</p> <p>Dömös Községi Önkormányzat</p> <p></p> <p>P.H.</p> <p>Aláírás dátuma: 2017. július.....</p>	



KÖZBESZERZÉSI TERV

Támogatási szerződés száma: TOP-4.1.1-15-KO1-2016-00012
 Kedvezményezett: Pilismarót Község Önkormányzata

Támogatást igénylő	Beszerezés tárgya	Becsült nettó érték	Közbeszerzési eljárás típusa	Megjegyzés
Pilismarót Község Önkormányzata	építési beruházás	33 926 869	Kbt. 115.§ (1) bekezdés szerinti eljárás	-

[Handwritten signature]

 Pilismarót Község Önkormányzata
 Kedvezményezett

 Kelt: Pilismarót, 2017. év július hónap ... napján

[Handwritten signature]

 Közreműködő Szervezet
 Tomasik Zoltánné
 osztályvezető
 Börgöndi Szilárd
 irodavezető

 Kelt: Tatabánya, 2017. év július hónap ... napján

[Handwritten signature]

RÖVID ÖSSZEFOGLALÁS A PROJEKTRŐL

Projekt megvalósítás helyszínei: Pilismarót Köztársaság tér 3. hrsz 268. ; Dömös Szent István utca 13. hrsz 527.

Dömös: A Dömös Szent István utcában található háziorvosi-házi gyermekorvosi, védőnői szolgálat épületének külső felújítása szükséges, a belső felújítása 8 évvel ezelőtt megtörtént az akadálymentesítési követelményeknek megfelelően. Két különálló épületrészből áll Dömösön a rendelő, egyikben található a háziorvos és a védőnő a másikban a fogorvos. A fogorvosnak helyet adó épületre nem terjed ki jelenleg a külső felújítás, ott a 8 évvel ezelőtti belső felújítás során megtörtént a nyílászárók cseréje is. A két épületrésznek közös az udvara, az udvar, mozgáskorlátozott parkoló felújítása, kialakítása mindkét részt érinti. A felújítás során egyrészt új tetőszerkezetet, tetőfedést, bádогоzást kapna az épület. Az elavult nyílászárók helyett 4 db új hőszigetelt nyílászáró kerül beépítésre, szükség van egy új hangszigetelt ajtóra, megtörténik az épület külső szigetelése, a fűdémszigetelés is. Az udvaron a gépkocsi és a személyi bejárati kapu cseréje került betervezésre, 2 db gépjármű részére mozgáskorlátozott parkoló kialakítása, a meglévő mozgáskorlátozott feljáró korláttal való ellátása. A projekt keretében eszközbeszerzésre is sor kerül a fogorvos, a háziorvos és a védőnő részére. A projekt hozzájárul a munkához jutás feltételeinek javításához, mivel elősegítheti a háziorvos, a fogorvos, a körzeti védőnő megtartását, ugyanis az épület korszerűsítése illetve az eszközbeszerzések javítani tudják a munkafeltételeket (külön védőnői képzésen elsajátított méhnyakrákszűrés elvégzésének minimumfeltételei megteremtődhetnek, elamortizálódott eszközök részben lecserélhetők, orvosszakmailag jobb műszerezettség érhető el), így nagyobb megtartó értéként szolgálhat. A dömösi rendelőben háziorvosi- házi gyermekorvosi vegyes praxis, védőnői és fogorvosi szolgáltatás működik. A háziorvosi, fogorvosi praxis jelenleg betöltött és Pilismarót községgel közös védőnői szolgálatunk van.

Pilismarót: A felújítani és átépíteni tervezett pilismaróti rendelő épületében több alapellátási forma működne a jövőben is, a betegellátási igényeknek jobban megfelelő körülmények között: - a háziorvosi ellátás, - a védőnői szolgálat, az iskola-egészségügyi szolgálat. Az önkormányzat tulajdonában álló épület igen elavult és korszerűtlen. A projekt keretén belül a jelenlegi szolgálati lakás egy részét igénybe véve bővíteni, korszerűsíteni szeretné az önkormányzat a háziorvosi rendelőt és a védőnői szolgálatot. Az orvosi rendelő és védőnői szolgálat megnövelt hasznos alapterülete 166,84 m², a szolgálati lakás hasznos alapterülete 57,72 m² lenne. A beruházás során megoldanák az intézmény teljes akadálymentesítését. A mozgáskorlátozottak számára kialakítandó mellékhelyiség is érdemi színvonaljavulást eredményez majd. A nyílászárók tönkrementek, elavultak, helyettük a jelenlegi hőtechnikai előírásoknak megfelelő nyílászárókat építenének be, emellett két teljesen új mellékhelyiséget is kialakítanának. Az ingatlanon az OTÉK előírásainak megfelelő számú parkolóhelyet létesítenének, a védőnői szolgálat várójában – családbarát funkcióként – játszósarkot és babakocsi-tárolót alakítanának ki, továbbá mivel a meglévő kerítés építészszakmai érvek alapján elbontandó, helyére téglaburkolatú lábazattal és pillérekkel, acél pálcás kerítés mezőkkel készül új kerítés.

Pilismaróton a pályázat keretében méhnyakrákszűrés elvégzését érintő eszközbeszerzésre kerülne sor a védőnői szolgálat részére.

PROJEKT HELYSZÍNE

Alulírott Pergel István Csaba polgármester, mint Pilismarót Község Önkormányzatának (2028 Pilismarót, Rákóczi u. 15.) aláírásra jogosult képviselője nyilatkozom, hogy a TOP-4.1.1-15-KO1-2016-00012 azonosítószámú projektet az alábbi helyszínen tervezzük megvalósítani:

Sorszám	Város	Cím
1.	Pilismarót	Köztársaság tér 3. (Helyrajzi szám: 268)
2.	Dömös	Szent István utca 15. (Helyrajzi szám: 527)

Kelt: Pilismarót, 2017. év július hónap ¹⁹ napján

.....
 Pilismarót Község Önkormányzata
 Képviseletének vezetője



Handwritten signature or initials in blue ink.

NYILATKOZAT RÉSZLETES KOMMUNIKÁCIÓS TERV BENYÚJTÁSÁRÓL

Alulírott Pergel István Csaba polgármester, mint Pilismarót Község Önkormányzatának (2028 Pilismarót, Rákóczi u. 15.) aláírásra jogosult képviselője nyilatkozom, hogy az „Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése Pilismarót és Dömös községben” című, TOP-4.1.1-15-KO1-2016-00012 azonosítószámú projektben a részletes kommunikációs tervet az alábbiak szerint nyújtjuk be*:

- 1. mérföldkő elérésekor
- **Nem releváns a részletes kommunikációs terv benyújtása, mivel a 150 millió Ft támogatási összeg alatti projekteknél nem elvárás a kommunikációs terv készítése**

Kelt: Pilismarót, 2017. év. július hónap ¹⁵ napján

Pilismarót Község Önkormányzata

Kedvezményezett



* megfelelő rész aláhúzendő

Handwritten signature or initials in blue ink.

**KONZORCIUMI TAGOK ESETÉBEN (AMENNYIBEN KORÁBBAN NEM KERÜLT
BENYÚJTÁSRA): ALÁÍRÁSI CÍMPÉLDÁNY/ALÁÍRÁS MINTA, VALAMINT AMENNYIBEN
DELEGÁLT JOG, AZ ALÁÍRÁSI JOGOSULTSÁGOT IGAZOLÓ DOKUMENTUM**

- Pergel István Csaba polgármester aláírási címpéldánya – Pilismarót Község Önkormányzata
- Herman Jenőné polgármester aláírási címpéldánya – Dömös Község Önkormányzata
- dr. Juhász János ügyvezető igazgató aláírási címpéldánya - Komárom-Esztergom Megyei Területfejlesztési Kft.

Handwritten signature

Handwritten signature

NYILATKOZAT ARRÓL, HOGY A TERVEZETT KÖLTSÉGEKET, TEVÉKENYSÉGENKÉNT, UTÓFINANSZÍROZÁS VAGY SZÁLLÍTÓI FINANSZÍROZÁS KERETÉBEN KIVÁNJA ELSZÁMOLNI

Támogatási szerződés száma: **TOP-4.1.1-15-KO1-2016-00012**
 Kedvezményezett: **Pilismarót Község Önkormányzata**

Alulírott Pergel István Csaba polgármester, mint Pilismarót Község Önkormányzatának (2028 Pilismarót, Rákóczi u. 15.) aláírásra jogosult képviselője nyilatkozom, hogy az „Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése Pilismarót és Dömös községben” című, TOP-4.1.1-15-KO1-2016-00012 azonosítószámú projekt kapcsán a projekt tevékenységeinek finanszírozását az alábbiak szerint tervezzük:

Költségkategória	Költségtípus	Megnevezés	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységár a jutó ÁFA (Ft)	Összesen (Ft)	Finanszírozás módja (szállítói finanszírozás/utó finanszírozás/vegyes finanszírozás)	Vegyes finanszírozás esetén	
							Támogatási összeg - Utófinanszírozás	Támogatási összeg - Szállítói finanszírozás
Projektelőkészítés költségei	Egyéb projektelőkészítéshez kapcsolódó költség	Műszaki tervek, kiviteli és tendertervek, ezek hatósági díjai	1 345 347	363 243	1 708 590	utófinanszírozás		
Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége	379 306	102 412	481 718	utófinanszírozás		

Handwritten signature

Handwritten signature


Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építés bekerülési értéke	33 926 869	9 160 255	43 087 124	utófinanszírozás	
Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzés költségei	Bekerülési érték	210 630	56 870	267 500	utófinanszírozás	
Elszámolható költségek:					45 544 932		

Kelt: Pilismarót, 2017. év. július hónap ¹⁷ napján

Jur. 17

.....
Pilismarót Község Önkormányzata

Kedvezményezett



Handwritten signature

NYILATKOZAT ARRÓL, HOGY A TERVEZETT KÖLTSÉGEKET, TEVÉKENYSÉGENKÉNT, UTÓFINANSÍROZÁS VAGY SZÁLLÍTÓI FINANSÍROZÁS KERETÉBEN KIVANJA ELSZÁMOLNI

Támogatási szerződés száma: TOP-4.1.1-15-KO1-2016-00012

Kedvezményezett: **Komárom-Esztergom Megyei Területfejlesztési Korlátolt Felelősségű Társaság**

Alulírott Dr. Juhász János, mint a Komárom-Esztergom Megyei Területfejlesztési Korlátolt Felelősségű Társaság (2800 Tatabánya, Fő tér 4.) ügyvezetője nyilatkozom, hogy az „Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése Pilismarót és Dömös községben” című, TOP-4.1.1-15-KO1-2016-00012 azonosítószámú projekt kapcsán a projekt tevékenységeinek finanszírozását az alábbiak szerint tervezzük:

Költségkategoría	Költség típus	Megnevezés	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységá ra jutó ÁFA (Ft)	Összesen (Ft)	Finanszírozás módja (szállítói finanszírozás/utó finanszírozás/veg yes finanszírozás)	Vegyes finanszírozás esetén	
							Támogatási összeg - Utófinanszíroz ás	Támogatási összeg - Szállítói finanszírozá s
Projektelőkészítés költségei	Egyéb projektelőkészítésh ez kapcsolódó költség	Egyéb szükséges háttéranyagok, szakvélemények költsége	700.000	0	700.000	utófinanszírozás		
Projektelőkészítés költségei	Közbeszerzési költségek	Közbeszerzési szakértő díja, közbeszerzési dokumentáció összeállítása, közbeszerzési tanácsadói tevékenység	581 718	0	581 718	utófinanszírozás		




Projektmenedzsmeni költség	Projektmenedzsmeni személyi jellegű ráfordítása	Személyi jellegű egyéb kifizetések	1 454 295	0	1 454 295	utófinanszírozás	
Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	290 859	0	290 859	utófinanszírozás	
Elszámolható költségek:						3 026 872	

Kelt: Tatabánya, 2017. év. július hónap ¹⁴ napján

.....
 Komárom-Esztergom Megyei Területfejlesztési Kft
 Kedvezményezett

Komárom-Esztergom Megyei
 P.H. Területfejlesztési Kft.
 2800 Tatabánya, Fő ter 4.
 Adószám: 25390676-2-11

EF

NYILATKOZAT ARRÓL, HOGY A TERVEZETT KÖLTSÉGEKET, TEVÉKENYSÉGENKÉNT, UTÓFINANSZÍROZÁS VAGY SZÁLLÍTÓI FINANSZÍROZÁS KERETÉBEN KIVANJA ELSZÁMOLNI

Támogatási szerződés száma: TOP-4.1.1-15-KO1-2016-00012
Kedvezményezett: Dömös Község Önkormányzata

Alulírott Herman Jenőné polgármester, mint Dömös Község Önkormányzatának (2027 Dömös, Táncsics M. u. 2.) aláírásra jogosult képviselője nyilatkozom, hogy az „Egységügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése Pilismarót és Dömös községben” című, TOP-4.1.1-15-KO1-2016-00012 azonosítószámú projekt kapcsán a projekt tevékenységeinek finanszírozását az alábbiak szerint tervezzük:

Költségkategória	Kölcségtípus	Megnevezés	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységárra jutó ÁFA (Ft)	Összesen (Ft)	Finanszírozás módja (szállítói finanszírozás/utófinanszírozás/vegyes finanszírozás)	Vegyes finanszírozás esetén Támogatási összeg - Utófinanszírozás	Támogatási összeg - Szállítói finanszírozás
Projektelőkészítés költségei	Egyéb projektelőkészítésh ez kapcsolódó költség	Műszaki tervek, kiviteli és tendertervek, ezek hatósági díjai	393 701	106 299	500 000	utófinanszírozás		
Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége	78 740	21 260	100 000	utófinanszírozás		
Beruházáshoz kapcsolódó	Építéshez kapcsolódó	Építés bekerülési	5 227 912	1 411 536	6 639 448	utófinanszírozás		




költségek	költségek	értéke			
Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzés költségei	Bekerülési érték	1 858 702	501 850	2 360 552
Elszámolható költségek:					9 600 000
					utófinanszírozás

Kelt: Dömös, 2017. év. július hónap 17 napján



Kemény József

 Dömös Község Önkormányzata
 Kezelve

Handwritten signature

EGYÉB A PROJEKTHEZ TARTOZÓ ALÁTÁMASZTÓ DOKUMENTUM(OK)

- Nyilatkozat Indikátorok - Dömös
- Nyilatkozat Indikátorok - Pilismarót
- Nyilatkozat Klímakockázat - Dömös
- Nyilatkozat Klímakockázat - Pilismarót
- Nyilatkozat 1. mérföldkőhöz - Pilismarót
- Nyilatkozat nem elszámolható költségek - Pilismarót
- Nyilatkozat nem elszámolható költségek - Dömös
- Műszaki leírás – rendelők Pilismarót
- Műszaki leírás – szolgálati lakás Pilismarót
- Komárom-Esztergom Megyei Területfejlesztési Kft. cégkivonat
- Fotók (4 db) Dömös
- Fotók (4 db) Pilismarót



A "Széchenyi 2020 Kedvezményezettek tájékoztatási kötelezettségei útmutató és arculati kézikönyv"-ben foglaltaknak megfelelően, a nyilvánosság és a tájékoztatás biztosítása érdekében tervezett tevékenységek

Támogatási szerződés száma: TOP-4.1.1-15-KO1-2016-00012

Kedvezményezett: Pilismarót Község Önkormányzata

Szerződésben megítélt támogatási összeg*: 58 171 804 Ft.

Kiemelt jelentőségű projekt	1 Mrd Ft feletti támogatási összeg	
Infrastrukturális fejlesztés	150 millió Ft alatti	X
	150-500 millió Ft	
	500 millió Ft feletti	
Egyéb fejlesztés (eszközbeszerzés, képzés, szoftverfejlesztés, bértámogatás, tanácsadás, stb.)	150 millió Ft alatti	
	150-500 millió Ft	
	500 millió Ft feletti	

Feladatok		Igen*	Nem*
A projekt előkészítő szakasza (1–4.)			
A projekt megvalósítási szakasza (5–9.)			
A projekt megvalósítását követő szakasz (10–14.)			
1	Kommunikációs terv készítése		X
2	Nyomatott tájékoztatók (brosúrák, szórólapok, stb.) elkészítése és lakossági terjesztése		X
3	A kedvezményezett működő honlapján a projekthez kapcsolódó tájékoztató (esetleg aloldal) megjelenítése és folyamatos frissítése a projekt fizikai zárásáig	X	
4	Sajtóközlemény kiküldése a projekt indításáról és a sajtómegjelenések összegyűjtése		X
5	Sajtó nyilvános események szervezése (ünnepélyes eseményekhez, pl. alapkövetétel, egyes beruházási fázisok befejezése, átadások, képzés zárása, stb.)		X
6	A beruházás helyszínén „A”, „B” vagy „C” típusú tábla elkészítése és elhelyezése	X	
7	Médiamegjelenés vásárlása a projekthez kapcsolódóan		X
8	Kommunikációs célra alkalmas fotódokumentáció készítése	X	
9	Sajtó-nyilvános ünnepélyes projektátadó rendezvény szervezése		X
10	Sajtóközlemény kiküldése a projekt zárásáról és a sajtómegjelenések összegyűjtése	X	
11	Eredménykommunikációs információs anyagok, kiadványok készítése		X
12	TÉRKÉPTÉR feltöltése a projekthez kapcsolódó tartalommal	X	
13	A beruházás helyszínén „D” típusú tábla elkészítése és elhelyezése		X

Kelt: Pilismarót, 2017. július 14. napján

Kedvezményezett cégszerű aláírása
Pergel István Csaba
 polgármester

* a megfelelő esetében "X" jelölés szükséges

NYILATKOZAT

Alulírott **Herman Jenőné** polgármester **Dömös Község Önkormányzata** (2027 Dömös, Táncsics M u. 2.) képviseletében a TOP-4.1.1-15-KO1-2016-00012 azonosítószámú, Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése Pilismarót és Dömös településeken című projekt kapcsán

nyilatkozom,

hogy a támogatói döntésben szereplő, monitoring mutatókra vonatkozó támogatási feltételt tudomásul vettem, az indikátorokat felülvizsgáltuk, és a Támogatási Szerződés 5. számú mellékletében a fenntartási időszakra vonatkozóan vállalást tettünk.

Dömös, 2017. június 30.

Herman Jenőné

Dömös Község Önkormányzata

Herman Jenőné
polgármester



Handwritten initials or mark in the bottom left corner.

NYILATKOZAT

Alulírott **Pergel István Csaba** polgármester **Pilismarót Község Önkormányzata** (2028 Pilismarót, Rákóczi u. 15.) képviseletében a TOP-4.1.1-15-KO1-2016-00012 azonosítószerű, Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése Pilismarót és Dömös településeken című projekt kapcsán

nyilatkozom,

hogy a támogatói döntésben szereplő, monitoring mutatókra vonatkozó támogatási feltételt tudomásul vettem, az indikátorokat felülvizsgáltuk, és a Támogatási Szerződés 5. számú mellékletében a fenntartási időszakra vonatkozóan vállalást tettünk.

Pilismarót, 2017. június 30.



Pilismarót Község Önkormányzata
Pergel István Csaba
polgármester



NYILATKOZAT

Alulírott **Herman Jenőné** polgármester **Dömös Község Önkormányzata** (2027 Dömös, Táncsics M u. 2.) képviseletében a TOP-4.1.1-15-KO1-2016-00012 azonosítójú, Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése Pilismarót és Dömös településeken című projekt kapcsán

nyilatkozom,

hogy a **projekt megvalósítását vagy eredményét extrém időjárási esemény** (árvíz, szárazság, forróság, tűz, vagy más időjárási kockázat) **nem veszélyezteti, a projektnek nincs előre látható klímakockázata.**

Dömös, 2017. június 30.

Herman Jenőné

Dömös Község Önkormányzata

Herman Jenőné
polgármester



[Handwritten mark]


NYILATKOZAT

Alulírott **Pergel István Csaba** polgármester **Pilismarót Község Önkormányzata** (2028 Pilismarót, Rákóczi u. 15.) képviseletében a TOP-4.1.1-15-KO1-2016-00012 azonosítószámú, Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése Pilismarót és Dömös településeken című projekt kapcsán

nyilatkozom,

hogy a **projekt megvalósítását vagy eredményét extrém időjárási esemény** (árvíz, szárazság, forróság, tűz, vagy más időjárási kockázat) **nem veszélyezteti, a projektnek nincs előre látható klímakockázata.**

Pilismarót, 2017. június 30.



Pilismarót Község Önkormányzata
Pergel István Csaba
polgármester



NYILATKOZAT

Alulírott **Pergel István Csaba** polgármester **Pilismarót Község Önkormányzata** (2028 Pilismarót, Rákóczi u. 15.) képviselőjében a TOP-4.1.1-15-KO1-2016-00012 azonosítójú, Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése Pilismarót és Dömös településeken című projekt kapcsán

nyilatkozom,

hogy a támogatói döntésben szereplő 1. mérföldkőhöz kapcsolódó feltételeket az alábbiak szerint teljesítjük :

- Bemutatjuk a Felhívás 5.6. és 5.7. pontjában megfogalmazott költségkorlátoknak való megfelelést.
- Bemutatjuk a Felhívás 3.2. pontjának való megfelelést.
- A tájékoztatás, nyilvánosság biztosítás költségelem vonatkozásában a „Kommunikációs csomagok keretében elszámolható költségek felső korlátai” című dokumentumban szereplő feltételnek való megfelelést igazoljuk.
- A költségvetést csökkentjük a nem elszámolható költséggel (bruttó 102.000 Ft – gyógyszeres szekrény, Nagysáp).
- A tételes eszközlístákat összhangba hozzuk a költségvetéssel (Nagysáp, Héreg).
- A klíma berendezéseket átcsoportosítjuk a beruházási költségsorra (Nagysáp).

Pilismarót, 2017. június 30.



Pilismarót Község Önkormányzata
Pergel István Csaba
polgármester




NYILATKOZAT

Alulírott **Pergel István Csaba** polgármester **Pilismarót Község Önkormányzata** (2028 Pilismarót, Rákóczi u. 15.) képviseletében a TOP-4.1.1-15-KO1-2016-00012 azonosítószámú, Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése Pilismarót és Dömös településeken című projekt kapcsán

nyilatkozom,

hogy a projekt építésre vonatkozó költsége elszámolható/ nem elszámolható költségekből tevődik össze, az alábbi megbontásban:

adatok Bruttó Ft-ban

Költségek	Pilismarót	
	Rendelők felújítása	Szolgálati lakás felújítása
Elszámolható költségek	41 157 254	1 929 870
Nem elszámolható költségek	-	18 871 968
Építés bekerülési értéke (tervezői költségbecslés alapján)	41 157 254	20 801 838

Pilismarót, 2017. június 30



Pilismarót Község Önkormányzata
Pergel István Csaba
polgármester




NYILATKOZAT

Alulírott **Herman Jenőné** polgármester **Dömös Község Önkormányzata** (2027 Dömös, Táncsics M u. 2.) képviselőjében a TOP-4.1.1-15-KO1-2016-00012 azonosítójú, Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése Pilismarót és Dömös településeken című projekt kapcsán

nyilatkozom,

hogy a projekt építésre vonatkozó költsége elszámolható/ nem elszámolható költségekből tevődik össze, az alábbi megbontásban:

Költségek	adatok Bruttó Ft-ban	
	Dömös	
	Rendelők felújítása	
Elszámolható költségek	6 639 448	
Nem elszámolható költségek	2 025 326	
Építés bekerülési értéke (tervezői költségbebecslés alapján)	8 664 774	

Dömös, 2017. június 30.

Herman Jenőné
 Dömös Község Önkormányzata
 Herman Jenőné
 polgármester



Handwritten initials or mark in the bottom left corner.

MŰSZAKI LEÍRÁS

háziiorvosi és gyermekgondozói rendelők felújítása, akadálymentesítése

ENGEDÉLYEZÉSI TERV

ÉPÍTETŐ:

PILISMARÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2028 PILISMARÓT, RÁKÓCZI F. U. 15.

ÉPÍTÉSI HELY:

2028 PILISMARÓT, KÖZTÁRSASÁG TÉR 3. HRSZ: 268

I. ÜTEM

TERVEZÉSI PROGRAM: a meglévő épületekben jelenleg is működik háziiorvosi rendelő, gyermekgondozói rendelő és egy szolgálati lakás. Jelen terv a rendelők tartalmozó épület teljes felújításával, szükség szerinti átalakításával és ezzel összefüggésben az akadálymentesítéssel foglalkozik a megvalósítás I. ütemében. A telek déli oldalán lévő, elbontandó rossz állapotú melléképületek helyén egy Gyógyszertár készül.

ELHELYEZÉS: nem változik, a faluközpontban lévő telek beépítési előírásai: VtaZu-Z,O/50/4,5/600 övezet, ezeknek a terv mindenben megfelel.

BONTÁS: a főépület D-i végén lévő kazánházat, garázst és egy tárolót tartalmazó toldaléképületet a rossz állapotuk miatt kell elbontani (ezek helyén épül majd a Gyógyszertár).

ALAPRAJZI KIALAKÍTÁS, BERENDEZÉS: az utcai épületben továbbra is helyet kap a háziiorvosi-, és a gyermekgondozói rendelő, valamint kialakításra kerül egy várandós és gyógytorna szoba. Az udvari épületrészben a szolgálati lakás lesz kialakítva, az elbontandó melléképület helyén Gyógyszertár készül.

A meglévő utcai bejárat a helyén marad. A közlekedő széles üvegfalakkal meg lesz nyitva a balra eső gyermekgondozói rendelő várója felé. A gyermekgondozói rendelő jobbra esik. Újonnan készül egy akadálymentes és kettő normál WC. Az udvarról is nyílik bejárat a parkolók felől ebbe a közlekedőbe.

A gyermekgondozói rendelő várójában pelenkázó asztalok, játéksarok és vele egy légtérben babakocsi tároló kerül kialakításra. A rendelőbe egy gondozói íróasztal (számítógéppel), vizsgáló asztal, pelenkázó asztalok, mérleg és műszerasztal, irat- és öltöző szekrény, egy mosdó könyökkel kezelhető csappal, egy mosogató és egy hűtő kerül. A gyermek váróból nyílik a tornaszoba egy raktárral. A közös közlekedőbe egy-egy rámpán lehet bejutni az utcáról és az udvarról is.

Az épület utcáról nézve bal oldalán az egyik ablak helyén egy, a meglévővel azonos kialakítású bejárati ajtó készül az újonnan kialakítandó váróba, ahová az udvari parkolók irányából is készül egy bejárat, mindkettő előtt rámpával. Innen érhető el a háziiorvosi rendelő, a személyzeti WC, a női WC, a férfi és egyben mozgáskorlátozott WC (az előírások szerinti méretekkel), a takarítószer tároló (mosógéppel, falikúttal, tároló szekrényel), raktárak és a személyzeti öltöző.

A háziiorvosi rendelőben készül egy vetkőző fülke, kettő íróasztal (számítógéppel), vizsgáló asztal, egy mosdó könyökkel kezelhető csappal, iratszokrény és egy hűtő kerül. A háziiorvosi kezelőbe egy vizsgálóasztal, egy mosogató, egy szekrény és egy mosdó könyökkel kezelhető csappal.

Az egész épületben (kivéve az utcai fronton már kicserélt néhány ablakot) az összes ajtó és ablak cserélni szorul, mert egyrészt tönkrementek, másrészt nem felelnek meg a hőtechnikai előírásoknak.

Az összes helyiségben 2,10 méter magasságig csempe falburkolat készítenendő.

AKADÁLYMENTESÍTÉS:

Az utcai és az udvari bejáratokhoz 5 %-os rámpákon lehet eljutni. A rámpák két oldalán korlát és lábléc készül. A korlátoknak az előírásnak megfelelően 70 és 90 cm magasságban is van vízszintes fogódzója. A mozgáskorlátozottak (egyben ffi.) részére külön WC-k készülnek, speciális WC kagylóval és mosdóval, fix és felhajtható kapaszkodókkal, és a kerekesszékeknek megfelelő méretekkel. A közlekedőkben 90 cm magasságban legalább az egyik oldalon fogódzó készül és a padlóburko-

latban eltérő színnel optikai vezetősávot kell kialakítani. Az új csempeburkolatba vízszintes vezetősíkokat kell beépíteni más színű csempéből. Ugyan így ki kell hangsúlyozni a nyílásokat, éleket. A bejáratoknál világító jelzéseket kell elhelyezni.

ALAPADATOK:

Beépített alapterület Rendelők:	207,42 m ²
Hasznos alapterület Rendelők:	166,84 m ²
Telek területe:	780,00 m ²
Beépítettség: max. 50,0 %	az összes épület tény 50,0 %
Építménymagasság: max 4,5 m >	átlag 3,9 m
Számított ép. érték=207,42 m ² x140,000,-Ft=	29.038.800.- Ft

ÉPÜLETSZERKEZETEK:

-alapozás: meglévő 80 cm széles, 100 cm mély beton sávalap.

-felmenő szerkezet: 38 cm vtg téglaburkolatú külső falak, nyomószilárdság 25 Nmm².

Egyenértékű hővez. tényező (W/mK) 0,17 (vakolatlan (habarcs=TM/M3) falazatra)

Páradiffúziós ellenállási szám 5/10

Tűzállósági határérték (óra) (2 x 1 cm mészcement vakolattal) REI-M 240

Tűvédelmi osztály A1

Szabvány MSZ EN 771-1:2011

Tűvédelmi jellemzők: tűzállósági teljesítmény (vakolatlan szerk.) - REI 30 -tűvédelmi osztály - A1. A bejegyzett tanúsító szervezet azonosító száma: 1415 (ÉMI) elvégezte a gyártó üzem, illetve a gyártásközi folyamat és termékellenőrzési rendszer kezdeti vizsgálatát, a következő számon tanúsítványt állította ki: 1415-CPD-118-(C-29/2012).

-válaszfalak: az új válaszfalak 10 cm vtg. válaszfallapból falazottak.

-födém: meglévő 20 cm vtg. fa gerendák, alul 3 cm stukatúr, felső deszkázat van agyagtapasztással.

-tető: a meglévő cserépfedésű torokgerendás fa tetőszerkezet jó állapotban van, a cserépfedés és a lécezés a közelmúltban felújításra kerültek.

-nyílászárók: a meglévő fa ablakokat, ajtókat ki kell bontani és helyettük műanyag ablakok és ajtók lesznek beépítve, amelyeknek az MSZ 9333 és az MSZ EN 14351-1:2006+A1:2010 előírásoknak kell megfelelniük.

-hőtechnikai megfelelés: az épület energetikai jellemzői megfelelnek a 7/2006. (V.24.) TNM valamint a 40/2012. Korm. rendeletnek, továbbá az MSZ 04-140-2 előírásainak, lásd energetikai szakvélemény.

-belső felületképzések: vakolt, meszelt falak készülnek, mindenhol 2,10 m magas csempeburkolattal.

-homlokzatképzés: a meglévő téglaburkolatot át kell csiszolni. Az új külső falak is téglaburkolatúak lesznek.

-gépészet: az épületek közműellátása közterületről kiépített **megfelelő keresztmetszetű** mért víz nyomóvezetési hálózattal, a meglévő és új fűtőberendezések gázellátását biztosító, az utcai gázvezeték hálózatról kiépített csatlakozó vezetékkel megoldott. A tartalékfűtést időszakosan üzemeltetett villamos készülékekkel lehet megoldani. A melegvíz ellátást a gázkazánok biztosítják tárolós megoldással, hőszigetelt csővezetékekkel. A keletkező szennyvizek elvezetésére új gravitációs vezeték épülnek ki. Az új berendezések a megfelelő átmérőjű meglévő gyűjtővezetésekre köthetők. a kijelölt helyiségek nyári meleg elleni védelme oldalfalra szerelt split klímaberendezésekkel lesz biztosítva.

-villamosság: az új fogyasztásmérő helyek az udvarba telepített 2 darabszabadtéri műanyag szekrényben lesznek. Az elektromos betáplálás az utcai 0,4 kV-os légvezetési oszlopról készül földkábelrel. A világítási hálózat védőcsőbe húzott M-1kV-os rézvezeték. A világítás kompakt fénycsöves és izzólámpás világítótestekkel készül. Az érintésvédelem nullázott (TN) rendszer. Több helyen telefon, ISDN és a később kijelölendő helyeken TV csatlakozást kell kiépíteni. Az épület bejáratai felett falilámpákat, az udvaron kettő darab burás lámpaoszlopot kell elhelyezni.

-villámvédelem: a létesítmény besorolása V00-L3a-F3/x/R1, M2, T2, K1, S1 fokozat amelynél nem kell külön felfogó rendszert telepíteni de a fémlemez fedésű tetőrészeket levezető vezetékkel és megfelelő védőföldeléssel kell ellátni. A belső túlfeszültség védelem fokozata B2e, ennek megfelelően többlépcsős túlfeszültség levezető rendszert kell kiépíteni.

-kerítés: a meglévő kerítés elbontandó, helyére téglaburkolatú lábazattal és pillérekkel, acél pálcás kerítés mezőkkel készül új kerítés.

-tartószerkezet: előzetes szakvélemény szerint.

-parkolás: 253/1997. (XII. 20.) Kormányrendelet 42. § és a 4. számú melléklet szerinti előírásnak megfelelően a telken kialakítható az előírt számú parkoló. A lakás után egy db parkolóhely szükséges. A rendelők várói $31,42 \text{ m}^2 = 4 \text{ db}$ és a Gyógyszertár eladó helyisége $23,52 \text{ m}^2 = 3 \text{ db}$, összesen 8 db parkolóhely, amelyekből egy darab mozgáskorlátozottak részére kialakított. A gyógyszerári áruszállítás miatt egy rakodóhely szerepel a tervben.

TERVEZŐI nyilatkozat: A 312/2012. (XI. 08.) Kormányrendelet szerint.

Pilismarót község területén, VtaZu-Z,O/50/4,5/600 övezetben található a beépített telek, amelyen az építendő a meglévő épület átalakítását és korszerűsítését kívánja elvégezni, a HÉSZ előírásait betartva. A fenti építendő részére készített rendelők engedélyezési tervhez készült statikai szakvélemény, nem keletkezik veszélyes hulladék, munkavédelmi szempontból megfelelő.

Nyilatkozom arra vonatkozóan, hogy a víz, a csatorna, a gáz és a villamos közművek rendelkezésre álló kapacitásai elegendőek a várható igények kielégítésére. Az alkalmazott műszaki megoldások megfelelnek az érvényes jogszabályoknak és szabványoknak, valamint kielégítik az OTÉK (253/1997.(XII.20. Korm. rend.) 50. § ide vonatkozó előírásait, ezektől nem kellett eltérni. Az előírt tervezői jogosultsággal rendelkezem. Az ÁNTSZ-el előzetes egyeztetés történt, az emlékeztető mellékelve. A KEM Kormány Hivatalában a megyei főgyógyyszerész asszonnyal a gyógyszerár tervét egyeztettem, szakmai tanácsot kaptam.

HELYISÉGJEGYZÉK:

A helyiségek megnevezése	Területe m ²	Burkolata	A helyiségek megnevezése	Területe m ²	Burkolata
Váró háziorvosi	24,49	Kerámia	Közlekedő	10,96	Kerámia
Háziorvosi rendelő	15,83	Kerámia	Váró gyerekgond. és tornaszoba	20,13	Kerámia
Háziorvosi kezelő	9,28	Kerámia	Tornaszoba	21,58	Parketta
Személyzeti WC előtere	0,69	Kerámia	Raktár	3,90	Kerámia
Személyzeti WC	1,11	Kerámia	Női és akadálymentes WC	3,80	Kerámia
Női WC előtere	0,75	Kerámia	Gyermekgondozói rendelő	19,32	Kerámia
Női WC	1,20	Kerámia	Előtér, takarítószer	4,16	Kerámia
Akadálymentes és ffi. WC	3,89	Kerámia	WC előtere	0,92	Kerámia
Raktár	2,77	Kerámia	Személyzeti WC	1,20	Kerámia
Takarítószer raktár	2,61	Kerámia	WC előtere	0,92	Kerámia
Személyzeti öltöző	6,87	Kerámia	Ffi WC	1,20	Kerámia
Raktár	6,61	Kerámia			
				Összesen: 166,84	

Dorog, 2016. 06. 12.

BEDŐ PÉTER TERVEZŐ

2510 DOROG, SZENT JÓZSEF U. 2.

5-11

MŰSZAKI LEÍRÁS

szolgálati lakás átalakítása, felújítása

ENGEDÉLYEZÉSI TERV

ÉPÍTETŐ:

PILISMARÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2028 PILISMARÓT, RÁKÓCZI F. U. 15.

ÉPÍTÉSI HELY:

2028 PILISMARÓT, KÖZTÁRSASÁG TÉR 3. HRSZ: 268

I. ÜTEM

ELŐZMÉNYEK: a faluközpontban lévő telek beépítési előírásai: VtaZu-Z,0/50/4,5/600 övezet, ezeknek a terv mindenben megfelel. A telek teljesen közművesített.

A meglévő épületekben jelenleg is működik háziorvosi rendelő, gyermekgondozói rendelő és egy szolgálati lakás. A telken található még rossz állapotú, bontandó toldalék épületek. Jelen terv a szolgálati lakást tartalmazó épület teljes felújításával foglalkozik a munkálatok I. ütemében.

ELHELYEZÉS: nem változik.

BONTÁS: a lakást tartalmazó épület részleges bontása indokolt, a tetőszerkezetét és megroggyant fafödémét, továbbá a D-i oldalon található falakat nedves, penészes rossz állapotuk miatt el kell bontani.

ALAPRAJZI KIALAKÍTÁS: A lakás bejárata az épület közepén található ez az előszobába vezet. Jobbra egy szoba, és egy félszoba, szemben a fürdőszoba található. Balra nyílik a nappali, az amerikai konyha, egy kamra és az étkező.

ALAPADATOK:

Beépített alapterület Lakás:	71,94 m ²
Hasznos alapterület Lakás:	57,72 m ²
Telek területe:	780,00 m ²
Beépítettség: max. 50,0 %	az összes épület tény 50,0 %
Építménymagasság: max 4,5 m>	átlag 3,90 m m
Számított ép. érték/100.000.-Ft/m ²	5.772.000.- Ft

ÉPÜLETSZERKEZETEK:

-alapozás: 50 cm széles, 100 cm mély beton sávalap.

-talajnedvesség elleni szigetelés: a megmaradó Északi fal alatt jó a szigetelés, az új falak alatt és a padlóban 2 rtg Gv-4 lemezszigetelés készül.

-felmenő szerkezet: 30 cm vtg meglévő és új külső falak, fehér mészhomok téglaburkolattal.

-válaszfalak: 10 cm vtg. falazott szerkezetűek.

-födém: 20 cm vtg. vb. lemez, 2 cm hangszigetelés, 5 cm esztrich, felül 15 cm ásványgyapot.

-tetőtér: térdfalas, vb pillérekkel és koszorúval.

-tető: hagyományos faszerkezet. -tetőfedés: párafékező fólia, 15 cm ásványgyapot, fólia, lécezés, ellenléc és égetett agyag cserépfedés.

-nyílászárók: fehér műanyag ablakok és ajtók lesznek beépítve, amelyeknek az MSZ 9333 és az MSZ EN 14351-1:2006+A1:2010 előírásoknak kell megfelelniük.

-hőtechnikai megfelelőség: az épület energetikai jellemzői megfelelnek a 7/2006. (V.24.) TNM valamint a 40/2012. Korm. rendeletnek, továbbá az MSz 04-140-2 előírásainak, lásd energetikai szakvélemény.

-belső felületképzések: vakolt, meszelt falak készülnek, a vizes helyiségekben 2,10 m magas csempeburkolattal.

-homlokzatképzés: a földszinten fehér mészhomok téglaburkolat, a tetőtéri és oromfalak vörösesbarna vékonyvakolat.

-gépészet: az épületek közműellátása közterületről kiépített **megfelelő keresztmetszetű** mért víz nyomóvezetési hálózattal, a meglévő és új fűtőberendezések gázellátását biztosító, az utcai gázvezeték hálózatról kiépített csatlakozó vezetékkel megoldott. A tartalékfűtést időszakosan üzemeltetett villamos készülékekkel lehet megoldani. A melegvíz ellátást a gázkazánok biztosítják tárolós megoldással, hőszigetelt

ELEKTRONIKUSAN HITELESÍTVE
ZÁRADÉKOLVA – ÉTDR

csővezetékekkel. A keletkező szennyvizek elvezetésére új gravitációs vezetékek épülnek ki. Az új berendezések a megfelelő átmérőjű meglévő gyűjtővezetésekre köthetők.

a kijelölt helyiségek nyári meleg elleni védelme oldalfalra szerelt split klímaberendezésekkel lesz biztosítva. -villamosság: az új fogyasztásmérő helyek az udvarba telepített 2 darabszabadtéri műanyag szekrényben lesznek. Az elektromos betáplálás az utcai 0,4 kV-os légvezetési oszlopról készül földkábelrel. A világítási hálózat védőcsőbe húzott M-1kV-os rézvezeték. A világítás kompakt fénycsöves és izzólámpás világítótestekkel készül. Az érintésvédelem nullázott (TN) rendszer. Több helyen telefon, ISDN és a később kijelölendő helyeken TV csatlakozást kell kiépíteni. Az épület bejáratai felett falilámpákat, az udvaron kettő darab burás lámpaoszlopot kell elhelyezni.

-villámvédelem: a létesítmény besorolása V0o-L3a-F3/x/R1, M2, T2, K1, S1 fokozat amelynél nem kell külön felfogó rendszert telepíteni de a fémlemez fedésű tetőrészeket levezető vezetékkel és megfelelő védőföldeléssel kell ellátni. A belső túlfeszültség védelem fokozata B2e, ennek megfelelően többlépcsős túlfeszültség levezető rendszert kell kiépíteni

-kerítés: a meglévő kerítés elbontandó, helyére téglaburkolatú lábazzal és pillérekkel, acél pálcás mezőkkel készül új kerítés.

-tartószerkezet: előzetes szakvélemény szerint.

-parkolás: 253/1997. (XII. 20.) Kormányrendelet 42. § és a 4. számú melléklet szerinti előírásnak megfelelően a telken kialakítható az előírt számú parkoló. A lakás után egy db parkolóhely szükséges. A rendelők várói 31,42 m²= 4 db és a Gyógyszertár eladó helyisége 23,52 m²= 3 db, összesen 8 db parkolóhely, amikből egy darab mozgáskorlátozottak részére kialakított. A gyógyszertári áruszállítás miatt egy rakodóhely szerepel a tervben.

TERVEZŐI nyilatkozat: A 312/2012. (XI. 08.) Kormányrendelet szerint.

Pilismarót község területén, VtaZu-Z, O/50/4,5/600 övezetben található a beépített telek, amelyen az építendő a meglévő épület átalakítását és korszerűsítését kívánja elvégezni, a HÉSZ előírásait betartva. A fenti építendő részére készített rendelők engedélyezési tervhez készült statikai szakvélemény, nem keletkezik veszélyes hulladék, munkavédelmi szempontból megfelelő.

Nyilatkozom arra vonatkozóan, hogy a víz, a csatorna, a gáz és a villamos közművek rendelkezésre álló kapacitásai elegendőek a várható igények kielégítésére. Az alkalmazott műszaki megoldások megfelelnek az érvényes jogszabályoknak és szabványoknak, valamint kielégítik az OTÉK (253/1997.(XII.20. Korm. rend.) 50. § ide vonatkozó előírásait, ezektől nem kellett eltérni. Az előírt tervezői jogosultsággal rendelkezem. Az ÁNTSZ-el előzetes egyeztetés történt, az emlékeztető mellékelve. A KEM Kormány Hivatalában a megyei főgyógyyszerész asszonnyal a gyógyszertár tervét egyeztettem, szakmai tanácsot kaptam.

HELYISÉGGJEGYZÉK:

A helyiségek megnevezése	Területe m ²	Burkolata	A helyiségek megnevezése	Területe m ²	Burkolata
Előszoba	6,29	kerámia	Nappali	21,70	parketta
Háló 1.	8,60	parketta	Konyha	3,99	kerámia
Háló 2.	6,83	parketta	Étkező	4,82	kerámia
Fürdő	3,29	kerámia	Kamra	2,20	kerámia
Összesen:					57,72

Dorog, 2016. 06. 12.

BEDŐ PÉTER TERVEZŐ
2510 DOROG, SZENT JÓZSEF U. 2.



Ceg0111 Mediator 5.1
Tatabányai Törvényszék Cégbírósága
2800 Tatabánya, Komáromi út 4.

Cégkivonat

A **Cg.11-09-023969** cégjegyzékszámú **Komárom-Esztergom Megyei Területfejlesztési Korlátolt Felelősségű Társaság (2800 Tatabánya, Fő tér 4.)** cég 2017. február 1. napján hatályos adatai a következők:

I. Cégformától független adatok

1. **Általános adatok**
Cégjegyzékszám: 11-09-023969
Cégforma: Korlátolt felelősségű társaság
Bejegyzve: 2015/10/19
2. **A cég elnevezése**
 - 2/1. Komárom-Esztergom Megyei Területfejlesztési Korlátolt Felelősségű Társaság
Bejegyzés kelte: 2015/10/19 Közzétéve: 2015/10/21
Hatályos: 2015/10/19 ...
3. **A cég rövidített elnevezése**
 - 3/1. Komárom-Esztergom Megyei Területfejlesztési Kft.
Bejegyzés kelte: 2015/10/19 Közzétéve: 2015/10/21
Hatályos: 2015/10/19 ...
5. **A cég székhelye**
 - 5/1. 2800 Tatabánya, Fő tér 4.
Bejegyzés kelte: 2015/10/19 Közzétéve: 2015/10/21
Hatályos: 2015/10/19 ...
8. **A létesítő okirat kelte**
 - 8/1. 2015. október 1.
Bejegyzés kelte: 2015/10/19 Közzétéve: 2015/10/21
Hatályos: 2015/10/19 ...
 - 8/2. 2016. április 28.
Bejegyzés kelte: 2016/06/03 Közzétéve: 2016/06/07
Hatályos: 2016/06/03 ...
 - 8/3. 2016. szeptember 29.
Bejegyzés kelte: 2016/10/28 Közzétéve: 2016/10/29
Hatályos: 2016/10/28 ...
902. **A cég tevékenysége**
 - 9/1. 7022 '08 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás

Főtevékenység.
Bejegyzés kelte: 2015/10/19 Közzétéve: 2015/10/21
Hatályos: 2015/10/19 ...
 - 9/2. 7021 '08 PR, kommunikáció
Bejegyzés kelte: 2015/10/19 Közzétéve: 2015/10/21
Hatályos: 2015/10/19 ...
 - 9/3. 7112 '08 Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás



Bejegyzés kelte: 2015/10/19 Közzétéve: 2015/10/21
Hatályos: 2015/10/19 ...

9/4. 7490 '08 M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység
Bejegyzés kelte: 2015/10/19 Közzétéve: 2015/10/21
Hatályos: 2015/10/19 ...

9/5. 8211 '08 Összetett adminisztratív szolgáltatás
Bejegyzés kelte: 2015/10/19 Közzétéve: 2015/10/21
Hatályos: 2015/10/19 ...

9/6. 8230 '08 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése
Bejegyzés kelte: 2015/10/19 Közzétéve: 2015/10/21
Hatályos: 2015/10/19 ...

9/7. 8413 '08 Üzleti élet szabályozása, hatékonyságának ösztönzése
Bejegyzés kelte: 2015/10/19 Közzétéve: 2015/10/21
Hatályos: 2015/10/19 ...

9/8. 5210 '08 Raktározás, tárolás
A változás időpontja: 2016/11/10
Bejegyzés kelte: 2016/11/14 Közzétéve: 2016/11/15
Hatályos: 2016/11/10 ...

11. **A cég jegyzett tőkéje**

11/1.

Megnevezés	Összeg	Pénznem
Összesen	6 000 000	HUF

Bejegyzés kelte: 2015/10/19 Közzétéve: 2015/10/21
Hatályos: 2015/10/19 ...

13. **A képviselőre jogosult(ak) adatai**

13/1.

Dr. Juhász János (an.: Kuti Éva)
Születési ideje: 1982/10/02
2471 Baracska, Széchenyi utca 42. B. ép.
Adóazonosító jel: 8422772582
A képviselő módja: **önálló**
A képviselőre jogosult tisztsége: ügyvezető (vezető tisztségviselő)
A hiteles cégaláírási nyilatkozat vagy az ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-minta benyújtásra került.

Jogviszony kezdete: 2015/10/01
Bejegyzés kelte: 2015/10/19 Közzétéve: 2015/10/21
Hatályos: 2015/10/19 ...

14. **A könyvvizsgáló(k) adatai**

14/2.

AUDIT-SERVICE Könyvszakértő, Adó- és Vezetési Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
HU-1022 Budapest, Bimbó út 3.01-09-078084
A könyvvizsgálatért személyében is felelős személy adatai:
Dr. Serényi Iván (an.: Desser Ibolya)
1025 Budapest, Zöldkő utca 4/7.
Jogviszony kezdete: 2016/10/01
Jogviszony vége: 2018/12/31
A változás időpontja: 2016/10/01
Bejegyzés kelte: 2016/10/28 Közzétéve: 2016/10/29
Hatályos: 2016/10/01 ...

15. **A felügyelőbizottsági tagok adatai**

15/1.

Borsó Tibor (an.: Kósa Julianna)



- 2890 Tata, Perényi utca 15.
Jogviszony kezdete: 2015/10/01
Bejegyzés kelte: 2015/10/19 Közzétéve: 2015/10/21
Hatályos: 2015/10/19 ...
- 15/3. Dr. Veres Zoltán (*an.: Sz kocsek Mária*)
2943 Bábolna, Csikótelepi út 11.
Jogviszony kezdete: 2015/10/01
Bejegyzés kelte: 2015/10/19 Közzétéve: 2015/10/21
Hatályos: 2015/10/19 ...
- 15/4. Kovács Cecília (*an.: Nagygyörgy Rozália*)
2800 Tatabánya, Mártírok útja 45. 2. em. 1.
Jogviszony kezdete: 2016/10/01
A változás időpontja: 2016/10/01
Bejegyzés kelte: 2016/10/28 Közzétéve: 2016/10/29
Hatályos: 2016/10/01 ...
20. **A cég statisztikai számjele**
20/1. 25390676-7022-113-11.
Bejegyzés kelte: 2015/10/19 Közzétéve: 2015/10/21
Hatályos: 2015/10/19 ...
21. **A cég adószáma**
21/1. Adószám: 25390676-2-11.
Közösségi adószám: HU25390676.
Adószám státusza: érvényes adószám
Státusz kezdete: 2015/10/12
Bejegyzés kelte: 2015/10/19 Közzétéve: 2015/10/21
Hatályos: 2015/10/19 ...
32. **A cég pénzforgalmi jelzőszáma**
32/1. 63200133-11075985-00000000
A számla megnyitásának dátuma: 2015/10/22.
A pénzforgalmi jelzőszámot a Pannon Takarékszövetkezet Bank Zrt. Tatabányai kirendeltség (2800 Tatabánya, Fő tér 20/a.) kezeli. 11-10-001669
Bejegyzés kelte: 2015/10/26 Közzétéve: 2015/10/28
Hatályos: 2015/10/26 ...
45. **A cég elektronikus elérhetősége**
45/1. A cég kézbesítési címe: kemteruletfejlesztesikft@gmail.com
Bejegyzés kelte: 2015/10/19 Közzétéve: 2015/10/21
Hatályos: 2015/10/19 ...
49. **A cég cégjegyzékszámjai**
49/1. 11-09-023969 Vezetve a Tatabányai Törvényszék Cégbírósága nyilvántartásában.
Bejegyzés kelte: 2015/10/19 Közzétéve: 2015/10/21
Hatályos: 2015/10/19 ...

II. Cégformától függő adatok

1. **A tag(ok) adatai**
1/1. Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat
HU-2800 Tatabánya, Fő tér 4.
A tagsági jogviszony kezdete: 2015/10/01
Bejegyzés kelte: 2015/10/19 Közzétéve: 2015/10/21
Hatályos: 2015/10/19 ...



5-11

A Tatabányai Törvényszék Cégbírósága hivatalosan igazolja, hogy ezen kiadmány adatai a bíróság jogerős végzésein alapulnak. A cégügyben el nem bírált módosítás nincs folyamatban.

A kiadmány a kérelmező Cgpk.11-17-000066 számon iktatott kérvénye alapján készült.

Tatabánya, 2017. február 1.

A kiadmány hitelül:



.....
Czuczor Klára
tisztviselő
PH.

Készült: 2017/02/01 09:33:55.



5-1

D-FORD



2/

4


D-1002



✓

7


D-fond 3

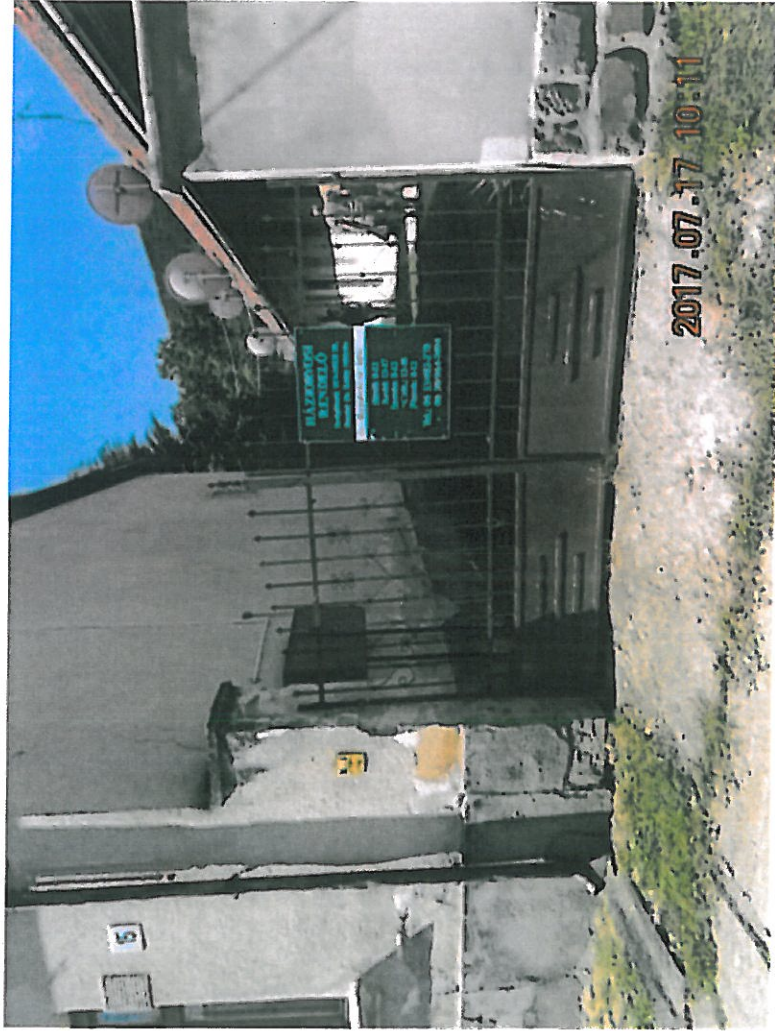

2

4

D-Ford4

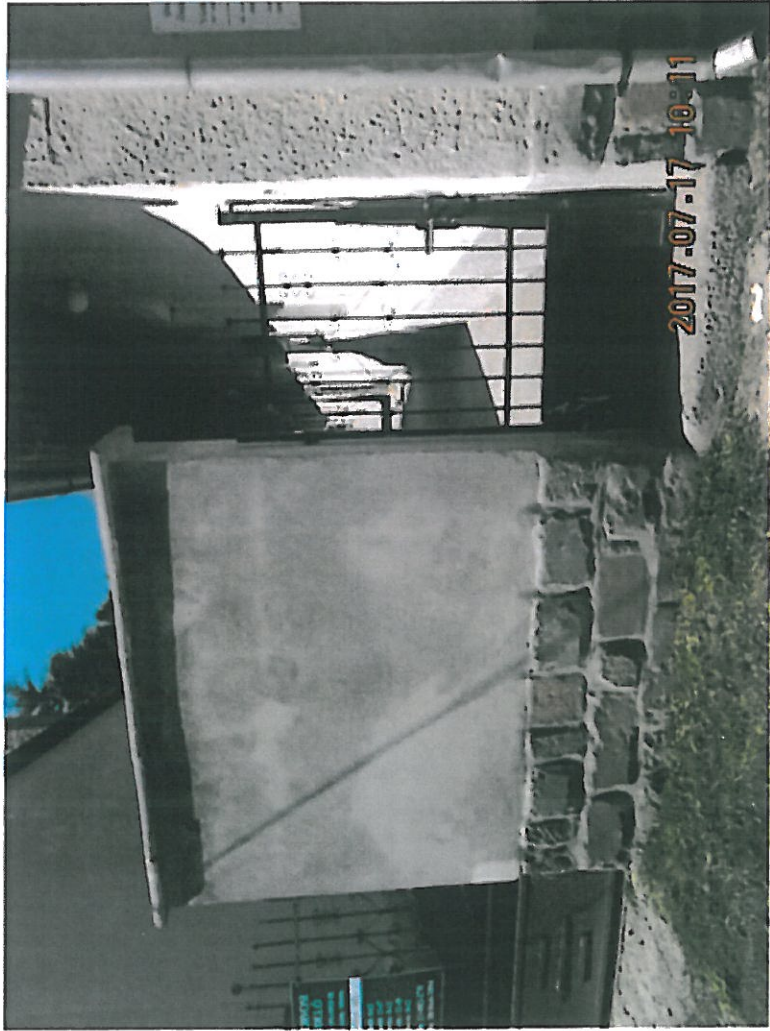

4

4

Photo 1

Jan



15

Foto 2



fin

✓



7/20/24

Jun

1/2

ALÁÍRÁS-MINTA

(Ctv. 9.§.)

Alulírott **Dr. Juhász János** (sz. Ajka, 1982. 10. 02., an: Kuti Éva) 2471 Baracska Széchenyi u. 42. B. ép. alatti lakos a **Komárom-Esztergom Megyei Területfejlesztési Korlátolt Felelősségű Társaság** (székh: 2800 Tatabánya, Fő tér 4.) ügyvezetőjeként a céget akként jegyzem, hogy a cég kézzel vagy géppel írt, előírt, előnyomott vagy nyomtatott cégneve fölé nevemet az alábbiak szerint önállóan írom:

.....
Dr. Juhász János
ügyvezető

Alulírott Dr. Kürtösi Tibor ügyvéd (Iroda: 2900 Komárom, Arany J. u. 15.) tanúsítom, hogy a fenti aláírás-mintát Dr. Juhász János szül.név: Juhász János (sz. Ajka, 1982. 10. 02., an: Kuti Éva, magyar állampolgár) 2471 Baracska, Széchenyi u. 42. B. ép. alatti lakos, aki személyazonosságát a 6579461A számú személyi igazolvánnyal, lakcímét a 847895 NL számú hatósági igazolvánnyal igazolta, előttem a mai napon saját kezűleg írta alá.

Ellenjegyzem 2015. október 01-jén:

Dr. Kürtösi Tibor
ügyvéd

A L Á Í R Á S I N Y I L A T K O Z A T

Alulírott **Herman Jenőné született Márkus Éva**, 2027 Dömös, Árpád telep 23. szám alatti lakos, mint a(z) **Dömös Község Önkormányzatának** (székhelye: 2027 Dömös, Táncsics Mihály utca 2.) **polgármestere**, nevemet az alábbiak szerint írom:

Esztergom, 2014. november 12.

Herman Jenőné



DR. D É V É N Y I N O R B E R T

K ö z j e g y z ő

H-2500 Esztergom, Lőrinc u. 17/IV. fszt. 12., Telefon: (33) 510-480,
Fax: (33) 510-489; E-mail: kozjegyzo@drdevenyi.hu

Ügyszám: 12018/H/2254/2014.

--- Alulírott közjegyzőhelyettes tanúsítom **Herman Jenőné született Márkus Éva** (született: Esztergom, 1964. december 13., anyja neve: Magyarovics Ilona, magyar állampolgár) 2027 Dömös, Árpád telep 23. szám alatti lakos, aki személyazonosságát a(z) 964637LA számú személyazonosító igazolványával, lakcímét pedig a(z) 620574LB számú hatósági igazolvánnyal igazolta, aláírásának valóságát. -----

Az ügyfél magyar nyelven nyilatkozik, hogy érti a magyar nyelvet, és a jelen okirat tartalmát érti. -----

Az ügyfél tudomásul vette a tájékoztatást a közjegyzőkről szóló 1991. évi XLI. törvény 122. § (2) bekezdése szerinti személyazonosság-ellenőrzés céljáról, módjáról és tartalmáról, a közjegyzői közreműködés megtagadásának kötelezettségéről és a közjegyzőkről szóló 1991. évi XLI. törvény 122. § (8) bekezdésében megjelölt bejelentési kötelezettségéről, valamint az ellenőrzés során megismert adatok kezeléséről. -----

A közjegyzőhelyettes csak a kézjegy, illetve a névaláírás valóságát tanúsítja. -----


--- Kelt, Esztergomban, 2014. (kettőezer-tizennegyedik) év november hónap 12. (tizenkettedik) napján. -----

dr. Neményi Péter
közjegyzőhelyettes

Erh

ALÁÍRÁSI CÍMPÉLDÁNY

Alulírott **Pergel István Csaba** 2028 Pilismarót, Dózsa György utca 18. szám alatti lakos, mint **Pilismarót Község Önkormányzatának** (székhelye: 2028 Pilismarót, Rákóczi út 15.) **polgármestere** az önkormányzatot akként jegyzem, hogy az előírt, előnyomott vagy előnyomtatott név alá nevemet **önállóan** írom az alábbiak szerint:



Dr. Beke Kamilla Judit közjegyző

2500 Esztergom, Aradi vértanúk tere 1. fszt. 1.

Telefon: 06-33/315-325, Tel/Fax.: 06-33/315-326


e-mail: beke@mokk.hu

12012-2/H/104/2016. szám-----

Alulírott esztergomi közjegyző-helyettes tanúsítom, hogy ezt az aláírási címpéldányt **Pergel István Csaba** született **Pergel István Csaba** (Esztergom, 1956. április 26., anyja születési neve: Makrai Eszter) 2028 Pilismarót, Dózsa György utca 18. szám alatti lakos, aki személyazonosságát a 271513 AE számú személyazonosító igazolványával, lakcímét pedig a 256402 ZL számú lakcímet igazoló hatósági igazolványával igazolta, előttem sajátkezűleg írta alá.-----

Az ügyfél kijelentette, hogy azt a nyelvet, amelyen az okirat készült és erre figyelemmel az okirat tartalmát érti. -----

Tájékoztattam az ügyfelet továbbá a Ktv. 122. §. 2-10 (bek.) foglaltáról, amely szerint a személyazonosság on-line ellenőrzése a 2007. évi LXIV. törvény 24. §-a alapján történik. Az aláírási címpéldány önmagában a képviseleti jog igazolására nem alkalmas.-----
Esztergom, 2016. (kettőezer-tizenhatodik) év április hónap 06. (hatodik) napján.-----


doktor Papp Ilkó
közjegyző-helyettes

